

計画名：安全で安心な魅力ある愛媛の公園づくり
(防災・安全)

都市整備課

計画の名称	1 安全で安心な魅力ある愛媛の公園づくり (防災・安全)																																				
計画の期間	平成27年度 ~ 令和元年度 (5年間)			交付対象	愛媛県																																
計画の目標	公園施設の老朽化が進む中で、計画的な維持管理及び改築・更新及びバリアフリー化等を実施するとともに、災害時に活用する広場や避難路の整備を行うことで、安全・安心を確保した快適な利用環境の整備を推進し、魅力ある愛媛の公園づくりの実現を目標とする。																																				
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている施設の改築 愛媛県営総合運動公園(体育館)への避難距離の減少 愛媛県営総合運動公園内の法面対策延長 																																				
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">達成率</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <th>(H27当初)</th> <th>(H29末)</th> <th>(R1末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 公園施設長寿命化計画に基づき改築する施設</td> <td>目標値: 0施設 実績値:</td> <td>40施設</td> <td>56施設 26施設</td> <td>46%</td> <td rowspan="3">公園長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の整備に努めてきたところであるが、厳しい財政状況の中、整備計画期間内で確保できた事業費が整備計画で計画した全体事業費に対して約半分に留まったため、施設更新の進捗に遅れが生じた。</td> </tr> <tr> <td>② 愛媛県営総合運動公園(体育館)への避難距離の減少</td> <td>目標値: 0m 実績値:</td> <td>600m</td> <td>600m 600m</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>③ 愛媛県営総合運動公園内の法面対策延長</td> <td>目標値: 0m 実績値:</td> <td>0m</td> <td>850m 850m</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>										定量的指標の現況値及び目標値			達成率	備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H27当初)	(H29末)	(R1末)	① 公園施設長寿命化計画に基づき改築する施設	目標値: 0施設 実績値:	40施設	56施設 26施設	46%	公園長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の整備に努めてきたところであるが、厳しい財政状況の中、整備計画期間内で確保できた事業費が整備計画で計画した全体事業費に対して約半分に留まったため、施設更新の進捗に遅れが生じた。	② 愛媛県営総合運動公園(体育館)への避難距離の減少	目標値: 0m 実績値:	600m	600m 600m	100%	③ 愛媛県営総合運動公園内の法面対策延長	目標値: 0m 実績値:	0m	850m 850m	100%
	定量的指標の現況値及び目標値			達成率	備考																																
	当初現況値	中間目標値	最終目標値																																		
	(H27当初)	(H29末)	(R1末)																																		
① 公園施設長寿命化計画に基づき改築する施設	目標値: 0施設 実績値:	40施設	56施設 26施設	46%	公園長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の整備に努めてきたところであるが、厳しい財政状況の中、整備計画期間内で確保できた事業費が整備計画で計画した全体事業費に対して約半分に留まったため、施設更新の進捗に遅れが生じた。																																
② 愛媛県営総合運動公園(体育館)への避難距離の減少	目標値: 0m 実績値:	600m	600m 600m	100%																																	
③ 愛媛県営総合運動公園内の法面対策延長	目標値: 0m 実績値:	0m	850m 850m	100%																																	
全体事業費(計画)	合計(A+B+C)	653百万円	A	646百万円	B	0百万円	C	7百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	1.1%	進捗率 (実施事業費/全体事業費)	58.8%																									
実施事業費(最終)	合計(A+B+C)	384百万円	A	380百万円	B	0百万円	C	4百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	1.0%																											

1. 交付対象事業

A 都市公園・緑地等事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率(%)	備考
											H27	H28	H29	H30	R1				
A12-001	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	都市公園安全・安心対策事業	総合運動公園他3箇所における公園施設の改築・バリアフリー化、公園施設長寿命化計画の策定(見直し)、建築物の耐震診断	松山市、砥部町、愛南町						406	214	52.7	
A12-002	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	都市公園等事業(愛媛県営総合運動公園)	公園整備 A=8.5ha	松山市、砥部町						100	26	26.0	
A12-003	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	都市公園等事業(愛媛県営総合運動公園)	公園整備 A=8.5ha	松山市、砥部町						20	20	100.0	
A12-004	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	都市公園等事業(愛媛県営総合運動公園 緊急点検)	公園整備 A=8.5ha	松山市、砥部町						120	120	100.0	
合計																646	380		
B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名(港湾・地区名)	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率(%)	備考	
										H27	H28	H29	H30	R1					
合計																0	0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考			

C 効果促進事業				直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	全体事業費 （百万円）	進捗率 （%）	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象							H27	H28	H29	H30	R1				
C12-001	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	公園標識整備事業	総合運動公園他3箇所 における公園標識の更 新及び整備	松山市、砥部 町、愛南町						7	4	57.1	
										合計					7	4		

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
C12-001	老朽化した危険標識の更新、災害時の利用者の危険回避及び防災上必要となる標識の整備を行うことで、公園の安全・安心を確保する。															

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況


I 定量的指標に関連する 交付対象事業（各要素事業）の 効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づく施設更新を行った結果、公園施設の長寿命化が図られた。また、県総合運動公園においては、園内の法面対策が完了し、施設利用者にとって安心・安全で快適な環境が整備された。
II 定量的指標以外の交付対象事業の効果の 発現状況 （必要に応じて記述）	

3. 特記事項（今後の方針等）

本整備計画で未整備となっている公園施設については、次期計画にて整備を行う。

(参考図面) 社会資本整備総合交付金

計画の名称	1 安全で安心な魅力ある愛媛の公園づくり (防災・安全)	交付対象	愛媛県
計画の期間	平成27年度 ~ 令和元年度 (5年間)		

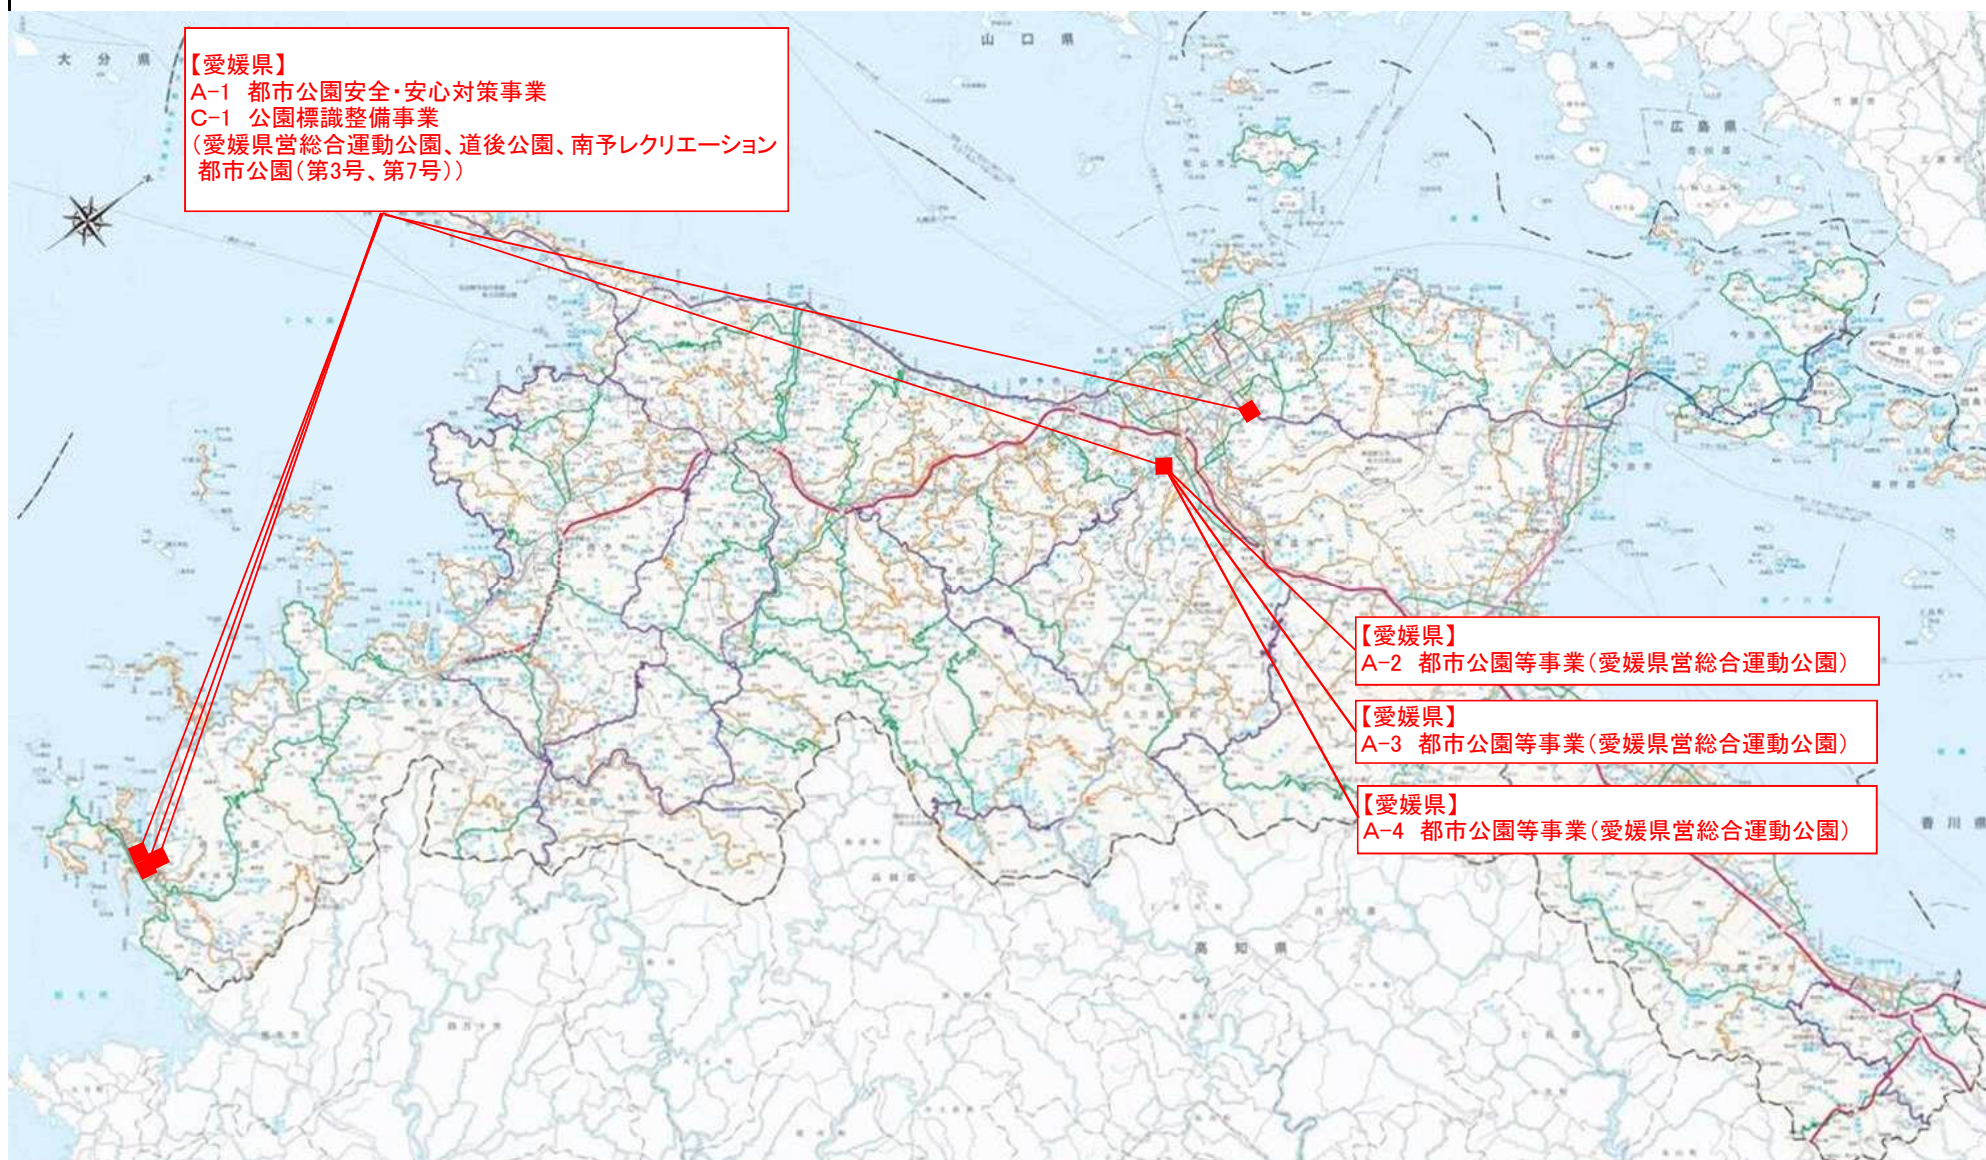

事業概要

【愛媛県】都市公園等事業(愛媛県営総合運動公園)

愛媛県営総合運動公園は、県民のスポーツ振興を図るとともに幅広いレクリエーション活動に対応するため、昭和47年度から松山広域都市計画事業として、建設を進め、昭和55年5月に開園し、昭和63年に開園した「愛媛県立とべ動物園」を含め、県内外の多くの方から利用されている。また、本公園は広域避難地として地域防災計画に位置づけられており、防災の観点からも重要な施設となっている。

本事業では、北部丘陵地の遊歩道整備や駐車場整備などを実施し、利用者の利便性や快適性を図るとともに、広域避難地としての機能向上を図る。



整備前



整備後

【愛媛県】都市公園安全・安心対策事業(第3号南予レクリエーション都市公園)

南予レクリエーション都市公園は、昭和47年度に事業着手し、昭和51年度の第1号公園のこども広場、第3号公園のおおもり児童公園のオープンを皮切りに、順次各公園の施設整備を行ってきたところであるが、建設から長期間が経過し、老朽化の著しい施設が目立ってきている。

本事業では、公園施設長寿命化計画に基づいた計画的な施設の改築・更新を行い、利用者の安全確保と快適な利用環境の維持を図る。



整備前



整備後
