

平成30年7月豪雨関連 砂防事業 位置図

令和4年6月

白浦・法花津地区の皆様へ

愛媛県南予地方局
河川港湾課長

(お知らせ) 平成30年7月豪雨関連 砂防事業の進捗について

日頃より、県行政の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。


愛媛県では、平成30年7月豪雨で甚大な被害が発生した白浦地区と法花津地区において、土砂災害の防止に向けた砂防事業を実施しているところです。

このたび、地元の皆様との情報共有を図りたく、現在の事業進捗及び今年度の事業をお知らせさせていただきますので、引き続き、事業へのご協力をお願いいたします。

なお、事業着手時の説明会等でお知らせした進捗に遅れが生じており、関係者の皆様にはご心配をおかけしているところです。早期完成に向けて誠意努めておりますので、重ねてご協力の程、お願い申し上げます。

- 位置図 → 右図
- 進捗表 → 右面
- 計画図 → 裏面
- 問い合わせ先

愛媛県南予地方局建設部河川港湾課 災害グループ
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号
電話 0895-22-5211 (内線435)

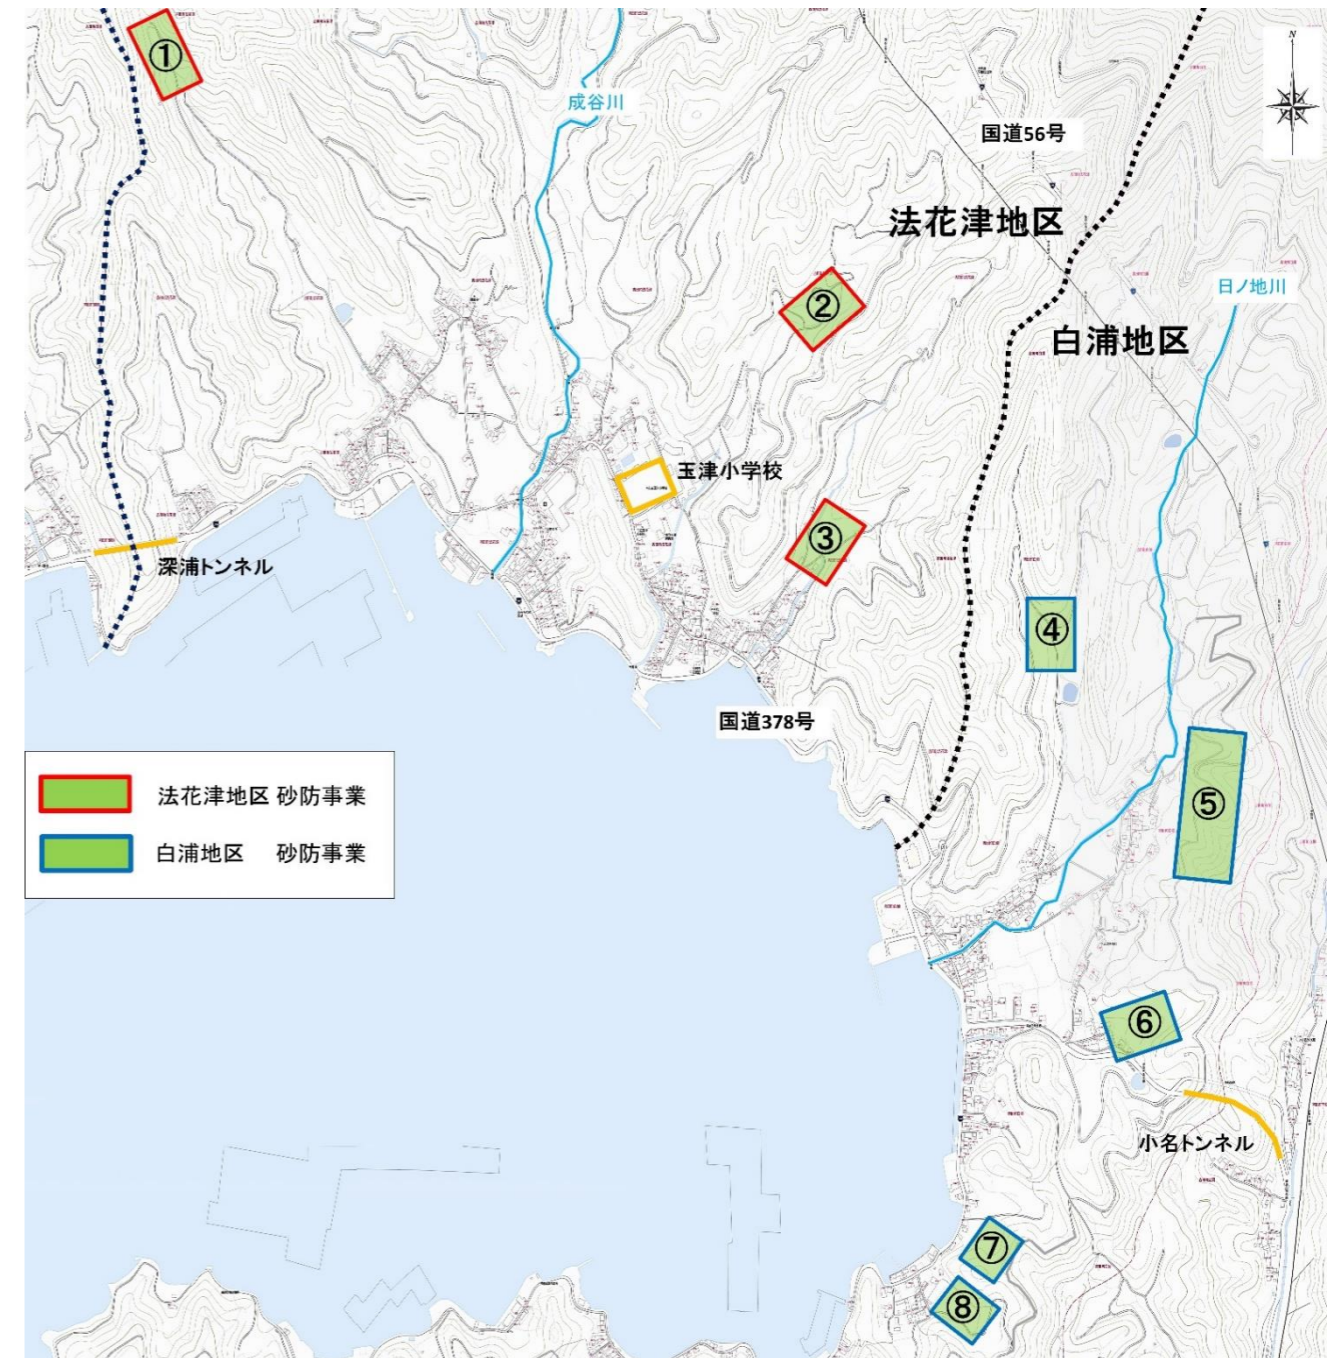

進捗表 (令和4年6月現在)

事業箇所	事業内容	事業進捗	令和4年度事業内容 (予定含む)
①小西川	砂防堰堤	工事着手	工事
②今郷川	法枠	工事中	工事
③大谷川	法枠	完成	-
④西ガ谷川	法枠	完成	-
⑤日ノ地川	砂防堰堤、法枠	工事中	工事
⑥泉川	砂防堰堤、法枠	工事中	工事
⑦先新浜川	砂防堰堤	工事中	工事
⑧畦屋東川	砂防堰堤	用地交渉中	用地交渉、工事

※工事着手は全ての用地を取得してからになりますので、着手時期は用地交渉の状況に影響されることをご理解願います。

【事業の流れ】

測量調査設計 → 国土交通省の設計確認 → 国土調査修正 → 用地調査 → 用地交渉 → 工事着手

【玉津地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図

法花津地区
 白浦地区

※令和4年6月現在の計画図であり、実施にあたっては細部が変更となる場合があります。

