

令和3年6月

立間地区(白井谷・荒巻・柏木・大河内・高城)の皆様へ

愛媛県南予地方局  
河川港湾課長

**(お知らせ) 平成30年7月豪雨関連 砂防事業の進捗について**

日頃より、県行政の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

愛媛県では、平成30年7月豪雨で甚大な被害が発生した立間地区において、土砂災害防止に向けた砂防事業を実施しております。昨年度は、国土調査修正や用地調査等を進め、一部の事業箇所では、工事に着手しているところです。

このたび、地元の皆様との情報共有を図りたく、現在の事業進捗をお知らせさせていただきますので、引き続き、事業へのご協力をお願いいたします。

なお、依然としてコロナ禍が続いており、各分野で大きな影響が出ております。砂防事業においても、コロナ対応の影響等により、事業説明会等でお伝えした進捗に遅れが生じておりますが、早期完成に向けて誠意努めて参りますので、重ねてご協力の程、お願い申し上げます。

- 位置図 → 右図
- 進捗表 → 右面
- 計画図 → 右面、裏面
- 問い合わせ先

愛媛県南予地方局建設部河川港湾課  
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号  
電話 0895-22-5211 (代表)  
災害グループ (内線435)  
河川港湾グループ (内線423)

※各事業箇所の担当グループについては「進捗表」に記載しております。




**進 捗 表 (令和3年6月現在)**

事業箇所	事業内容	事業進捗	令和3年度事業内容	担当係	内線番号
①高城谷川	砂防堰堤	国土調査修正を完了	用地調査、用地交渉	災害グループ	435
②下高城川	砂防堰堤	国土調査修正を完了	用地調査、用地交渉	災害グループ	435
③白井谷G	砂防堰堤	国土調査修正を完了	用地調査、用地交渉	河川港湾グループ	423
④白井谷E	砂防堰堤	用地調査中	用地交渉	河川港湾グループ	423
⑤白井谷B	砂防堰堤	用地交渉を完了	工事着手	河川港湾グループ	423
⑥白井谷F	砂防堰堤	中止	中止	河川港湾グループ	423
⑦白井谷I	砂防堰堤	用地調査中	用地交渉	河川港湾グループ	423
⑧白井谷J	砂防堰堤	用地調査中	用地交渉	河川港湾グループ	423
⑨白井谷A	砂防堰堤	工事中	工事中	河川港湾グループ	423
⑩白井谷D	砂防堰堤	用地調査中	用地交渉	河川港湾グループ	423
⑪白井谷H	砂防堰堤	用地調査中	用地交渉	河川港湾グループ	423
⑫白井谷C	砂防堰堤	工事中	工事中	河川港湾グループ	423
⑬荒巻川	砂防堰堤	国土交通省の設計確認中	国土調査の修正、用地調査、用地交渉	河川港湾グループ	423
⑭大明神川	砂防堰堤	用地調査中	用地調査、用地交渉	河川港湾グループ	423
⑮津田川	砂防堰堤	用地調査中	用地調査、用地交渉	河川港湾グループ	423
⑯上谷ノ内川	砂防堰堤	用地調査中	用地調査、用地交渉	災害グループ	435
⑰下谷ノ内川	砂防堰堤	用地調査中	用地調査、用地交渉	災害グループ	435
⑱正木谷	砂防堰堤	用地調査中	用地調査、用地交渉	河川港湾グループ	423
⑲黒坪川	砂防堰堤	用地調査中	用地調査、用地交渉	災害グループ	435

※立間地区の事業の流れ

測量調査設計 → 国土交通省の設計確認 → 国土調査修正 → 用地調査 → 用地交渉 → 工事着手

**【立間地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図 (1/2)**

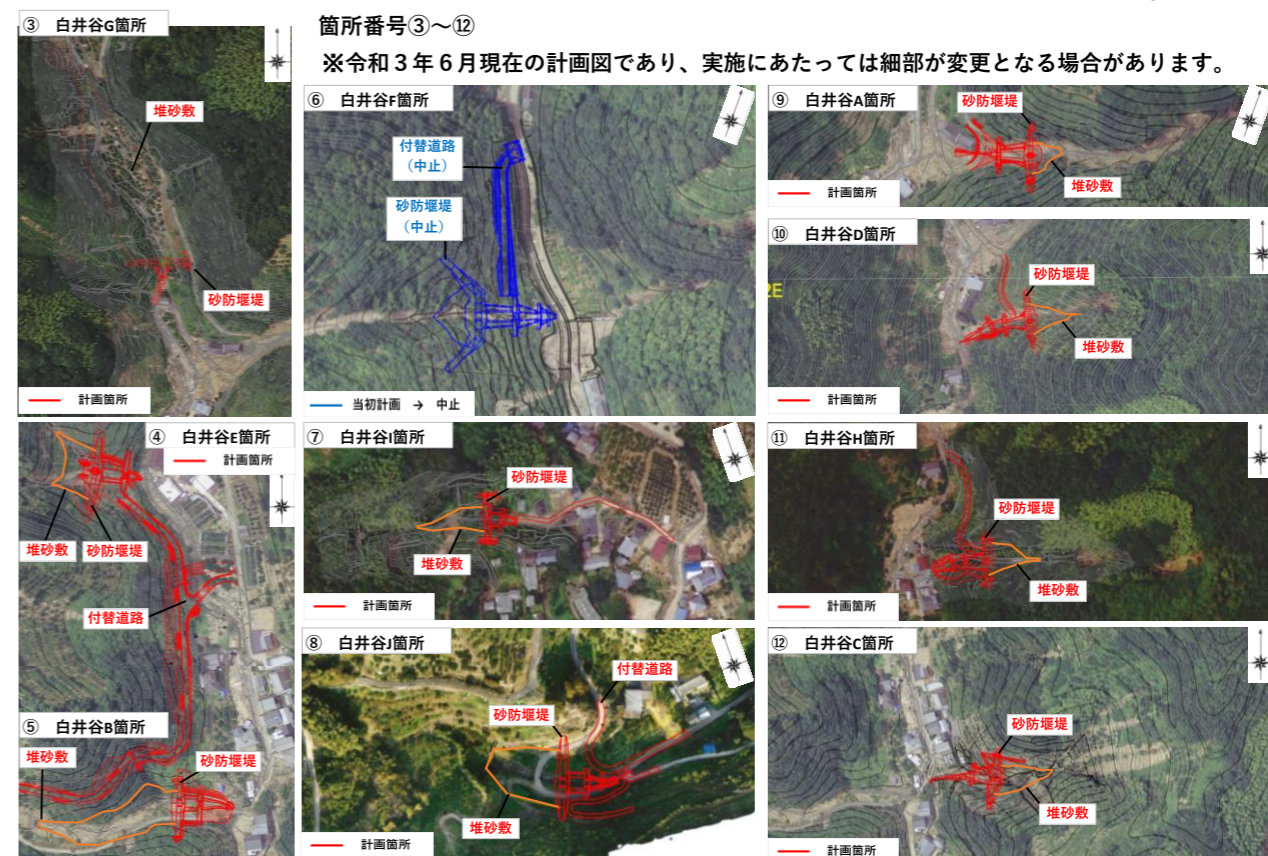

# 【立間地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図（2/2）

箇所番号①、②、⑨～⑱

※令和3年6月現在の計画図であり、実施にあたっては細部が変更となる場合があります。

