


●高架区間(愛光工区)平面図

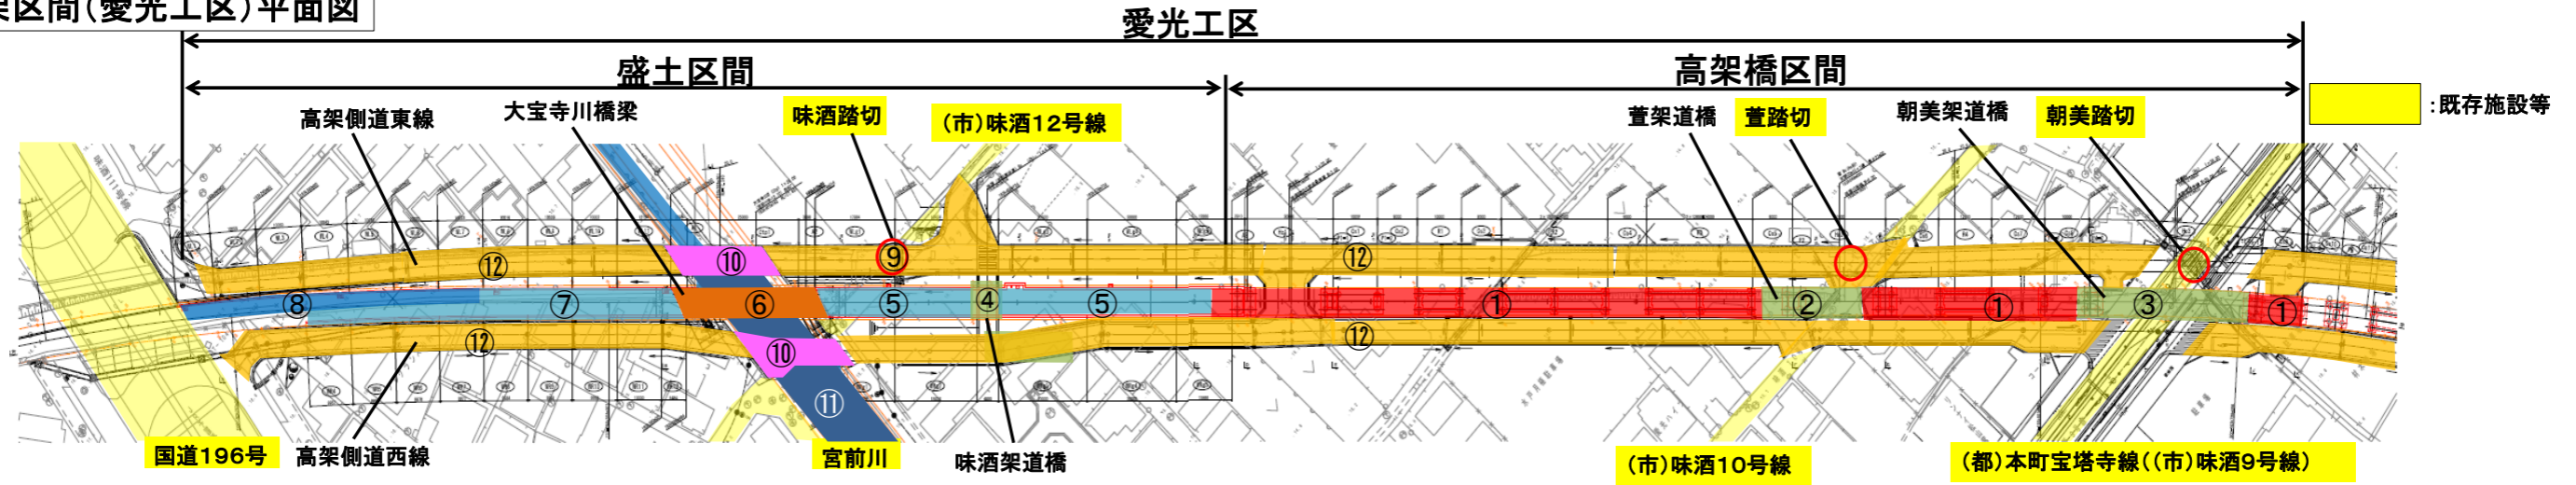


●JR松山駅付近連続立体交差事業 高架区間(愛光工区)の全体工程表

工事名	工事箇所	主な工事内容	平成30年												平成31年												平成32年												平成33年												平成34年												平成35年												平成36年												平成37年																																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
その1	① 高架橋工事(一般部)	既設構造物の取壊し(圧砕機等による取壊し) 基礎杭の施工(掘削、鉄筋、コンクリート打設等) 仮土留の施工(鋼矢板の圧入)	[Red bar]																																																																																																																																			
その2	① 高架橋工事(一般部)	ケーシングの施工(鉄筋、コンクリート打設等) 仮設足場の設置 柱、上床、高欄の構築(鉄筋、コンクリート打設等)	[Red bar]																																																																																																																																			
その2	② 萱架道橋工事	基礎杭、仮土留の施工、橋台の構築 橋桁の搬入(トレーラーによる搬入) 橋桁の架設(大型クレーンによる架設)													[Green bar]																																																																																																																							
その2	③ 朝美架道橋工事	基礎杭、仮土留の施工、橋台の構築 橋桁の搬入(トレーラーによる搬入) 橋桁の架設(大型クレーンによる架設)																									[Green bar]																																																																																																											
その3	④ 味酒架道橋工事	地盤改良の施工(掘削、埋め戻し等) 橋梁の構築(鉄筋、コンクリート打設等) 舗装工事																									[Green bar]																																																																																																											
その3	⑤ 盛土工事(終点方)	地盤改良の施工(掘削、埋め戻し等) 補強盛土の施工(コンクリート打設、盛土構築等) 防音壁の設置																									[Cyan bar]																																																																																																											
その3	⑥ 鉄道橋下部工事(宮前川)	仮土留の施工(鋼矢板の圧入) 基礎杭の施工(掘削、鉄筋、コンクリート打設等) 橋台の構築(掘削、鉄筋、型枠、コンクリート打設)																									[Orange bar]																																																																																																											
その3	⑥ 鉄道橋上部工事(宮前川)	作業橋台の設置 橋桁の製作(鉄筋、型枠、PC緊張) 橋桁の設置、作業橋台の撤去																																					[Orange bar]																																																																																															
その4	⑦ 盛土工事(起点方)	土留擁壁の施工(鋼矢板圧入、コンクリート打設等) 補強盛土の施工(コンクリート打設、盛土構築等) 防音壁の設置																																																	[Cyan bar]																																																																																			
その4	⑧ 盛土工事(残工事)	現在線の盛土撤去 土留擁壁の施工(鋼矢板圧入、コンクリート打設等) 防音壁の設置																																																													[Cyan bar]																																																																							
他工事	⑨ 踏切工事(味酒踏切)	仮踏切の設置 迂回路の設置 仮橋の設置及び撤去																									[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]																																																																																			
他工事	⑩ 側道橋工事(宮前川)	基礎杭、仮土留の施工、橋台の構築 橋桁の搬入(トレーラーによる搬入) 橋桁の架設(大型クレーンによる架設)																									[Pink bar]												[Pink bar]												[Pink bar]												[Pink bar]												[Pink bar]												[Pink bar]												[Pink bar]																																			
他工事	⑪ 護岸工事(宮前川)	仮土留の施工(鋼矢板の圧入) 護岸ブロックの施工(掘削、ブロック積み) 仮土留の撤去(鋼矢板の引き)													[Blue bar]												[Blue bar]												[Blue bar]												[Blue bar]												[Blue bar]												[Blue bar]												[Blue bar]																																															
他工事	⑫ 側道工事	境界構造物の施工(コンクリート擁壁、水路等) 舗装工事(路盤、アスファルト舗装、路面標示等)																																																													[Yellow bar]												[Yellow bar]												[Yellow bar]												[Yellow bar]												[Yellow bar]												[Yellow bar]											

愛光工区の工事において、道路の通行制限を予定している工事

- ② 萱架道橋工事
(市)味酒10号線
平成31年8月頃 架道橋架設時に数日間の夜間通行止め予定
- ③ 朝美架道橋工事
(市)味酒9号線
平成32年1月頃 架道橋架設時に数日間の夜間通行止め予定
- ⑨ 味酒踏切の切替工事
(市)味酒12号線
平成32年1月～7月頃 1次切替工事(32年8月から切替予定)
平成33年8月～12月頃 2次切替工事(34年1月から切替予定)

●⑨味酒踏切の切替方法

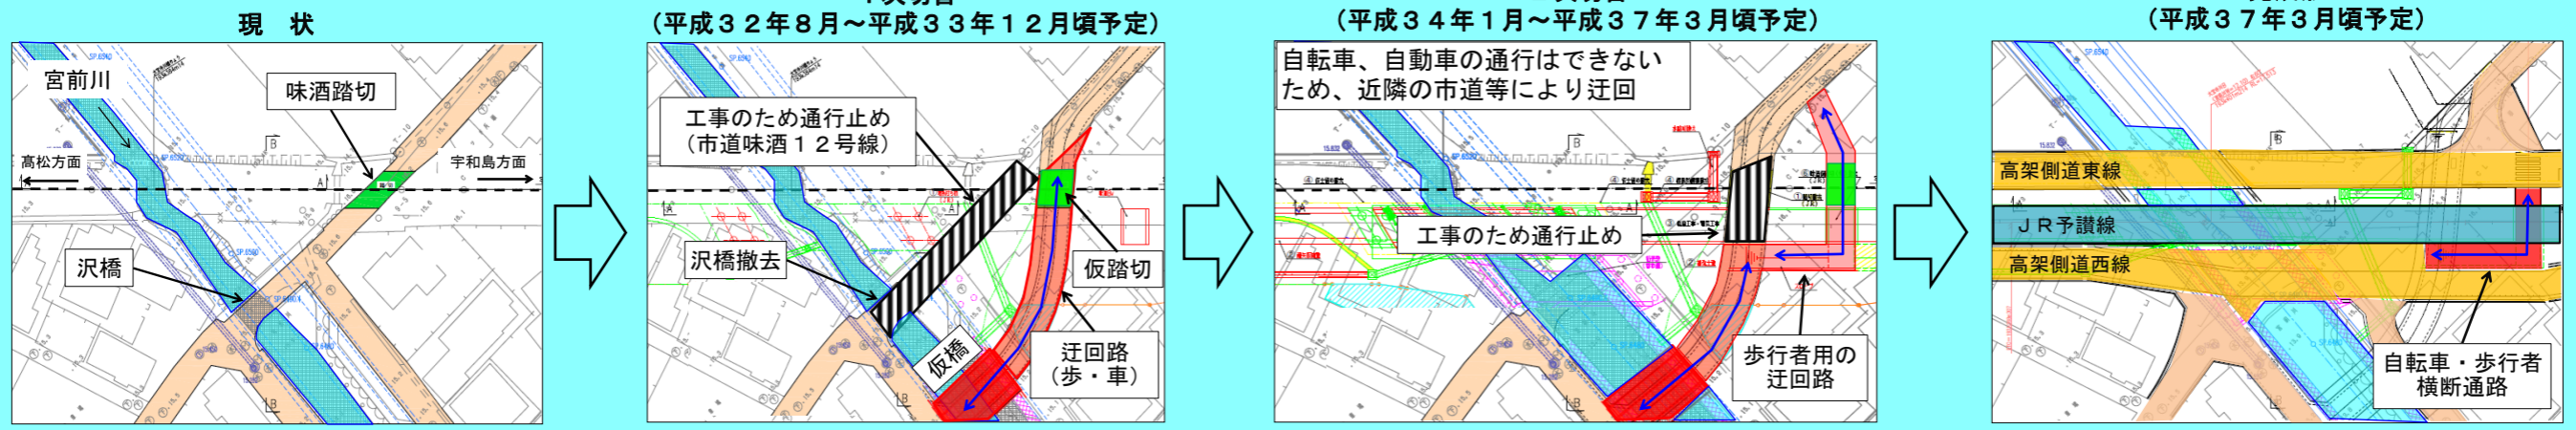

迂回路の期間や方法については、工事の進捗等により変更の可能性がありますので、地元関係者の皆様には、その都度情報提供させていただきます。
