社会資本総合整備計画　事後評価書

計画名：災害につよい愛顔あふれる川づくり
～洪水・地震・津波による河川災害から命を守る～　（防災・安全）

河川課

（参考）　社会資本総合整備計画　事後評価書~~（中間評価書）~~

令和8年6月9日

計画の名称	1　災害につよい愛顔あふれる川づくり　～洪水・地震・津波による河川災害から命を守る～　（防災・安全）
計画の期間	令和2年度　～　令和6年度　（5年間）　　交付対象　愛媛県、西条市、松山市、松前町、八幡浜市、宇和島市、松野町、伊予市、東温市、今治市、新居浜市、砥部町、内子町
計画の目標	愛媛県が管理する河川は、延長3,072km（全国第6位）と非常に長いが、これらの多くは流路が短く急流で、洪水時には水位が急上昇し、浸水被害が多発している。 さらに、本県においては、南海トラフを震源とする地震の発生が懸念されており、地震・津波などにより甚大な被害がもたらされることが想定されている。 こうした愛媛の河川の特性に適応した浸水対策を推進し、洪水や地震・津波等の災害に強い川をつくり、県民の安全・安心な生活を確保する。

計画の成果目標（定量的指標）

・過去に浸水被害（床上、床下）を受けた家屋のうち、未だ浸水の恐れがある戸数を5年間で299戸（R6目標値）減少させる。
・水防上、危険な箇所となっている県下の重要水防箇所において、5年間で11,000m（R6目標値）整備する。
・愛媛県が管理する大規模な排水機場、水門について、長寿命化計画に基づく延命化を5年間で8施設（R6目標値）実施する。
・地震による液状化で沈下し、堤内地被害を及ぼす堤防について、5年間で120m（R6目標値）耐震対策を実施する。
・レベル1津波により、越水の恐れのある河川における津波対策について、5年間で1河川（R6目標値）実施する。
・愛媛県が管理するダムについて、大規模災害による電力供給停止時における連続運転を5年間で2施設（R6目標値）可能とする。

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 （R2当初）	中間目標値 （R4末）	最終目標値 （R6末）	達成率	備考
①過去に洪水により浸水を受けた家屋のうち、被災時と同程度の出水で、5年間浸水被害が避けられる家屋数 過去に浸水を受けた家屋数×5年間の整備事業費/全体事業費　目標値： 実績値：	0戸	189戸	299戸 366戸	122%	
②重要水防箇所における堤防整備必要延長が5年間整備され減少する延長 今までの重要水防区域の整備延長の実績から整備延長の近似式を作成し、今後の5年間の整備延長を算定　目標値： 実績値：	0m	6,600m	11,000m 28,600m	260%	
③県管理の大規模な排水機場、水門施設における長寿命化計画に基づく延命化を実施する施設数 長寿命化に基づく延命化の実施施設数　目標値： 実績値：	7施設	8施設	8施設 0	0%	交付金の緊急対策や個別補助に移行して事業の進捗を図ったため。
④堤防耐震点検により耐震補強が必要とされた堤防のうち、対策が実施された堤防延長 耐震点検により、堤防の耐震対策が必要とされた堤防延長のうち、今後5年間で耐震対策される堤防延長を算定　目標値： 実績値：	0m	0m	120m 290m	242%	
⑤レベル1津波により、越水の恐れのある河川における津波対策の実施河川数 津波対策を実施する河川数　目標値： 実績値：	0河川	1河川	1河川 1河川	100%	
⑥大規模災害による電力供給定時における連続運転（72時間以上）を可能としたダム 連続運転時間を満足している施設数　目標値： 実績値：	4施設	6施設	6施設 6施設	100%	

全体事業費（計画）	合計（A+B+C+D）	45,604百万円	A	42,568百万円	B	895百万円	C	2,141百万円	D	00百万円	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）	4.7%	進捗率（実施事業費/全体事業費）	78.6%
実施事業費（最終）	合計（A+B+C+D）	35,848百万円	A	33,142百万円	B	596百万円	C	2,110百万円	D	00百万円	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）	5.9%		

1．交付対象事業

A1　河川事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） R2	R3	R4	R5	R6	全体事業費（百万円）	実施事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
A03-001	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（1）	－	肱川（下流）広域河川改修事業	L=8100m、築堤、護岸、橋梁	大洲市						8,500	8,810	103.6	
A03-002	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（2）	－	金生川広域河川改修事業	L=300m、築堤、護岸、掘削、橋梁	四国中央市						322	211	65.5	
A03-003	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（2）	－	界谷川広域河川改修事業	排水機場整備	西条市						1,050	713	67.9	
A03-004	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（2）	－	中山川広域河川改修事業	L=500m、築堤、護岸、掘削、橋梁	西条市						582	545	93.6	
A03-005	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（2）	－	浅川広域河川改修事業	L=100m、護岸	今治市						748	516	69.0	

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	実施事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
											R2	R3	R4	R5	R6				
A03-006	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（2）	－	大川広域河川河川改修事業	L=1000m、築堤、護岸、掘削	松山市						514	359	69.8	
A03-007	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（2）	－	宮前川広域河川改修事業	L=150m、護岸、掘削	松山市						310	337	108.7	
A03-008	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（1）	－	肱川広域河川改修事業	L=150m、築堤、護岸、掘削	西予市						472	340	72.0	
A03-009	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（1）	－	広見川広域河川改修事業	L=300m、築堤、護岸	松野町、鬼北町						900	888	98.7	
A03-010	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（1）	－	内平ヶ谷川広域河川改修事業	L=100m、築堤、護岸、掘削、堰	宇和島市						410	409	99.8	
A03-011	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（2）	－	立間川広域河川改修事業	設計、用地補償	宇和島市						142	0	0.0	
A03-012	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	地震高潮（2）	－	愛媛県地震・高潮対策河川事業（加茂川）	L=100m、堤防耐震対策	西条市						570	699	122.6	
A03-013	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	地震高潮（2）	－	愛媛県地震・高潮対策河川事業（蒼社川）	L=100m、堤防耐震対策	今治市						110	102	92.7	
A03-014	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	地震高潮（2）	－	愛媛県地震・高潮対策河川事業（金生川）	L=40m、堤防耐震対策	四国中央市						40	0	0.0	
A03-015	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	地震高潮（2）	－	愛媛県地震・高潮対策河川事業（新川）	水門耐震化	西条市						150	93	62.0	
A03-016	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	地震高潮（2）	－	愛媛県地震・高潮対策河川事業（岩松川他）	地震津波対策	宇和島市他						550	225	40.9	
A03-017	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	特構（2）	－	王子川排水機場特定構造物改築事業	排水機場延命化	新居浜市						90	0	0.0	
A03-018	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	特構（2）	－	王子川水門特定構造物改築事業	水門延命化	新居浜市						30	0	0.0	
A03-019	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	特構（2）	－	茨の木水門特定構造物改築事業	水門延命化	西条市						0	0	0.0	
A03-020	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	特構（2）	－	猿子川水門特定構造物改築事業	水門延命化	今治市						0	0	0.0	
A03-021	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	特構（2）	－	大谷川水門特定構造物改築事業	水門延命化	伊予市						0	0	0.0	
A03-022	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堰堤改良（2）	－	鹿森ダム堰堤改良事業	放流設備改良等	新居浜市						202	143	70.8	
A03-023	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堰堤改良（2）	－	黒瀬ダム堰堤改良事業	放流設備改良等	西条市						366	229	62.6	
A03-024	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堰堤改良（2）	－	台ダム堰堤改良事業	放流設備改良等	今治市						296	143	48.3	
A03-025	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堰堤改良（2）	－	須賀川ダム堰堤改良事業	放流設備改良等	宇和島市						472	93	19.7	
A03-026	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堰堤改良（2）	－	山財ダム堰堤改良事業	放流設備改良等	宇和島市						331	122	36.9	
A03-058	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	地震高潮（2）	－	愛媛県地震・高潮対策河川事業（小田川）	樋門耐震化	内子町						70	13	18.6	
A03-114	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堰堤改良（2）	－	玉川ダム堰堤改良事業	放流設備改良等	今治市						91	90	98.9	
A03-115	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	地震高潮（2）	－	愛媛県地震・高潮対策河川事業（中山川）	L=100m、堤防耐震対策	西条市						130	58	44.6	
A03-116	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	地震高潮（2）	－	愛媛県地震・高潮対策河川事業（宮前川）	堰耐震化	松山市						150	202	134.7	
A03-147	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（2）	－	東川広域河川改修事業	L=4,000m、護岸、橋梁	新居浜市						329	278	84.5	
A03-166	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（2）	－	内川広域河川改修事業	築堤、護岸	松山市						200	122	61.0	
A03-169	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（2）	－	国領川広域河川改修事業	築堤、護岸	新居浜市						200	127	63.5	
A03-170	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（2）	－	中川広域河川改修事業	築堤、護岸	今治市						200	34	17.0	
A03-171	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	地震高潮（2）	－	愛媛県地震・高潮対策河川事業（契川他）	堤防耐震対策	四国中央市他						300	294	98.0	
															小計（河川事業）	18,827	16,195		

A2　その他総合的な治水事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容（延長・面積・水深等）	市町村名/港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	実施事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
											R2	R3	R4	R5	R6				
A08-027	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（尻無川）	L=300m、護岸、掘削	新居浜市						230	54	23.5	
A08-028	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	重信川圏域総合流域防災事業（御坂川）	L=200m、築堤、護岸、堰	松山市						520	414	79.6	
A08-029	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	重信川圏域総合流域防災事業（明神川）	L=100m、護岸、掘削	松山市						248	209	84.3	
A08-030	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	愛媛県南部圏域総合流域防災事業（増穂川）	L=300m、護岸、掘削、橋梁	宇和島市						110	32	29.1	
A08-031	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	愛媛県南部圏域総合流域防災事業（内平川）	L=100m、護岸	宇和島市						550	324	58.9	
A08-032	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（川茂川）	L=50m、護岸	四国中央市						150	70	46.7	
A08-033	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（堀子川）	L=20m、護岸	四国中央市						16	0	0.0	
A08-034	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堤防質的	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（関川）	L=100m、護岸	四国中央市						300	49	16.3	
A08-035	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堤防質的	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（金生川）	L=100m、築堤、護岸	四国中央市						16	0	0.0	
A08-036	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堤防質的	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（関川（土居工区））	L=260m、築堤、護岸	四国中央市						1,150	1,328	115.5	
A08-037	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堤防質的	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（添谷川）	L=100m、築堤、護岸	四国中央市						16	0	0.0	
A08-038	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堤防質的	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（浦山川）	L=100m、築堤、護岸	四国中央市						36	0	0.0	
A08-039	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	情報・河川	－	総合流域防災事業（河川情報基盤整備）	河川情報設備改修等	県内全域						340	135	39.7	
A08-040	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	金生川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	四国中央市						10	10	100.0	
A08-041	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	関川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	四国中央市						10	10	100.0	
A08-042	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	中山川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西条市						30	30	100.0	
A08-043	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	加茂川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西条市						30	0	0.0	
A08-044	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	東川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	新居浜市						32	0	0.0	
A08-045	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	国領川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	新居浜市						154	216	140.3	
A08-046	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	蒼社川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						30	35	116.7	
A08-047	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	嵩富川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	大洲市						22	19	86.4	
A08-048	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	矢落川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	大洲市						30	15	50.0	
A08-049	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	肱川（下流）（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	大洲市						10	5	50.0	
A08-050	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	肱川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						10	10	100.0	
A08-051	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	小田川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	内子町						56	79	141.1	
A08-052	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	来村川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						12	12	100.0	
A08-053	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	広見川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	鬼北町・松野町						18	18	100.0	
A08-054	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	岩松川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						36	36	100.0	
A08-055	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	長月川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	愛南町						6	6	100.0	
A08-056	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堤防質的	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（蒼社川）	L=500m、築堤	今治市						200	110	55.0	
A08-057	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	愛媛県南部圏域総合流域防災事業（惣川）	L=200m、築堤	愛南町						400	378	94.5	

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容（延長・面積・水深等）	市町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	実施事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
											R2	R3	R4	R5	R6				
A08-059	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堤防質的	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（頓田川）	L=100m、築堤	今治市						150	84	56.0	
A08-060	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	金生川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	四国中央市						366	209	57.1	
A08-061	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	関川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	四国中央市						534	438	82.0	
A08-062	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	国領川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	新居浜市						800	459	57.4	
A08-063	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	東川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	新居浜市						295	221	74.9	
A08-064	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	加茂川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西条市						700	433	61.9	
A08-065	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	大明神川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西条市						290	128	44.1	
A08-066	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	中山川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西条市						590	472	80.0	
A08-067	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	頓田川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						700	590	84.3	
A08-068	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	多岐川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						24	1	4.2	
A08-069	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	黒岩川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						16	0	0.0	
A08-070	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	蒼社川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						784	721	92.0	
A08-071	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	谷山川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						56	20	35.7	
A08-072	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	奈良ノ木川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						10	0	0.0	
A08-073	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	品部川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						100	31	31.0	
A08-074	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	猿子川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						130	46	35.4	
A08-075	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	浅川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						50	0	0.0	
A08-076	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	日吉川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						20	0	0.0	
A08-077	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	山田川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						10	0	0.0	
A08-078	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	小野川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松山市						290	153	52.8	
A08-079	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	伊台川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松山市						78	18	23.1	
A08-080	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	御坂川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松山市						260	163	62.7	
A08-081	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	大川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松山市						292	182	62.3	
A08-082	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	久万川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松山市						44	9	20.5	
A08-083	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	吉藤川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松山市						48	2	4.2	
A08-084	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	表川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	東温市						410	281	68.5	
A08-085	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	宝泉川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	東温市						34	22	64.7	
A08-086	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	滑川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	東温市						40	0	0.0	
A08-087	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	大谷川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松前町						190	124	65.3	
A08-088	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	砥部川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	砥部町						198	171	86.4	
A08-089	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	肱川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	大洲市						1,710	771	45.1	

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容（延長・面積・水深等）	市町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	実施事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
											R2	R3	R4	R5	R6				
A08-090	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	河辺川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	大洲市						70	53	75.7	
A08-091	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	久米川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	大洲市						80	50	62.5	
A08-092	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	伴造川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	大洲市						50	13	26.0	
A08-093	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	矢落川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	大洲市						50	22	44.0	
A08-094	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	中山川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	内子町						200	35	17.5	
A08-095	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	麓川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	内子町						40	17	42.5	
A08-096	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	嵩富川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	大洲市						30	0	0.0	
A08-097	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	小田川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	内子町						766	701	91.5	
A08-098	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	千丈川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	八幡浜市						195	109	55.9	
A08-099	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	五反田川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	八幡浜市						80	16	20.0	
A08-100	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	湯藤川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	八幡浜市						10	0	0.0	
A08-101	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	喜木川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	八幡浜市						180	147	81.7	
A08-102	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	肱川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						332	450	135.5	
A08-103	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	岩瀬川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						20	0	0.0	
A08-104	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	三滝川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						50	67	134.0	
A08-105	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	野井川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						10	0	0.0	
A08-106	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	稲生川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						46	28	60.9	
A08-107	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	戸石川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						10	0	0.0	
A08-108	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	岩松川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						360	388	107.8	
A08-109	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	立間川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						150	52	34.7	
A08-110	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	三間川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市・鬼北町						400	268	67.0	
A08-111	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	広見川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	鬼北町・松野町						490	266	54.3	
A08-112	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	惣川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	愛南町						90	11	12.2	
A08-113	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	僧都川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	愛南町						330	220	66.7	
A08-117	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堤防質的	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（中山川）	L=60m、築堤、護岸	西条市						298	467	156.7	
A08-118	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堤防質的	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（崩口川）	L=140m、護岸	西条市						200	155	77.5	
A08-119	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堤防質的	－	重信川圏域総合流域防災事業（石手川）	L=100m、築堤、護岸	松山市						210	212	101.0	
A08-120	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（国領川他）	堤防質的改良	新居浜市他						200	213	106.5	
A08-121	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	重信川圏域総合流域防災事業（石手川他）	堤防質的改良	松山市他						210	101	48.1	
A08-122	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	肱川圏域総合流域防災事業（肱川他）	堤防質的改良	大洲市他						200	46	23.0	
A08-123	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	愛媛県南部圏域総合流域防災事業（広見川他）	堤防質的改良	宇和島市他						200	91	45.5	

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容（延長・面積・水深等）	市町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	実施事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
											R2	R3	R4	R5	R6				
A08-124	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	渦井川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	新居浜市						220	253	115.0	
A08-125	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	室川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西条市						100	101	101.0	
A08-126	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	北川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西条市						110	132	120.0	
A08-127	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	石手川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松山市						70	179	255.7	
A08-128	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	内川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松山市						100	43	43.0	
A08-129	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	立岩川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松山市						540	461	85.4	
A08-130	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	藤の郷川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	伊予市						4	7	175.0	
A08-131	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	中山川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	伊予市						10	9	90.0	
A08-132	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	清水田川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						4	5	125.0	
A08-133	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	平野川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						4	3	75.0	
A08-134	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	十丁川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						6	1	16.7	
A08-135	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	瀬戸川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						4	5	125.0	
A08-136	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	赤滝川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						4	5	125.0	
A08-137	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	大谷川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						4	2	50.0	
A08-138	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	鳥越川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						9	11	122.2	
A08-139	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	田穂川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						4	1	25.0	
A08-140	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	深山川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						4	12	300.0	
A08-141	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	富野川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						4	6	150.0	
A08-142	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	来村川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						210	231	110.0	
A08-143	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	芳原川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						96	119	124.0	
A08-144	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	野井川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						26	3	11.5	
A08-145	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	須賀川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						170	141	82.9	
A08-146	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	長月川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	愛南町						90	35	38.9	
A08-148	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	情報・河川	－	水害リスク情報整備推進事業	水害リスク情報整備	県内全域						495	249	50.3	
A08-149	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	堤防質的	－	愛媛県東部圏域総合流域防災事業（浅川）	L=400m、護岸	今治市						400	130	32.5	
A08-150	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	尻無川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	新居浜市						45	52	115.6	
A08-151	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	木地川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						10	6	60.0	
A08-152	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	大野川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						10	0	0.0	
A08-153	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	高大寺川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	今治市						4	5	125.0	
A08-154	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	内川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松山市						10	3	30.0	
A08-155	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	悪社川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松山市						10	2	20.0	

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容（延長・面積・水深等）	市町村名/港湾・地区名	事業実施期間（年度） R2	R3	R4	R5	R6	全体事業費（百万円）	実施事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
A08-156	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	高山川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	松山市						10	0	0.0	
A08-157	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	田渡川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	内子町						100	49	49.0	
A08-158	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	遠近川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						70	30	42.9	
A08-159	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	増穂川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						90	93	103.3	
A08-160	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	本村川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						160	100	62.5	
A08-161	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	本覚川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						70	74	105.7	
A08-162	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	大宿川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	鬼北町						180	256	142.2	
A08-163	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	奈良川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	鬼北町						280	232	82.9	
A08-164	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	成泰川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	鬼北町						20	9	45.0	
A08-165	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域系	－	赤木川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	愛南町						40	31	77.5	
A08-167	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	都谷川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	大洲市						50	40	80.0	
A08-168	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	蓮乗寺川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	愛南町						30	14	46.7	
A08-172	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	鍵山川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						30	37	123.3	
A08-173	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	重信川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	東温市						50	78	156.0	
A08-174	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	東川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						40	6	15.0	
A08-175	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	魚成川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						40	27	67.5	
A08-176	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	駕谷川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						30	0	0.0	
A08-177	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	三島川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	西予市						50	31	62.0	
A08-178	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	御代の川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						40	70	175.0	
A08-179	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	－	日向谷川（樹木伐採・土砂掘削）	樹木伐採・土砂掘削	宇和島市						30	7	23.3	
													小計（その他総合的な治水事業）			23,741	16,947		
													合計			42,568	33,142		

B　関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容（延長・面積等）	市町村名/港湾・地区名	事業実施期間（年度） R2	R3	R4	R5	R6	全体事業費（百万円）	実施事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
B03-001	河川	一般	愛媛県	直接	愛媛県	広域河川（1）	－	橋梁整備事業（県道菅田五郎停車場線　逆投橋）	橋梁	大洲市						895	596	66.6	
													合計			895	596		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
B03-001	肱川河川改修に関連して、橋梁の架替えを行うことにより、断面の狭小部が解消され、計画流量を安全に流下させることができる。	

C　効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市町村名/港湾・地区名	事業実施期間（年度） R2	R3	R4	R5	R6	全体事業費（百万円）	全体事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
C08-001	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	情報・河川	－	水害リスク情報の提供	水害リスク情報の提供	県内全域						1,949	1,935	99.3	
C08-002	総合治水	一般	西条市	直接	西条市	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（渦井川）	洪水ハザードマップの作成	西条市						10	8	80.0	
C08-003	総合治水	一般	松山市	直接	松山市	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（立岩川他）	洪水ハザードマップの作成	松山市						6	5	83.3	
C08-004	総合治水	一般	松前町	直接	松前町	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（大谷川）	洪水ハザードマップの作成	松前町						3	2	66.7	
C08-005	総合治水	一般	八幡浜市	直接	八幡浜市	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（喜木川）	洪水ハザードマップの作成	八幡浜市						8	5	62.5	
C08-006	総合治水	一般	宇和島市	直接	宇和島市	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（岩松川他）	洪水ハザードマップの作成	宇和島市						20	52	260.0	
C08-007	総合治水	一般	松野町	直接	松野町	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（広見川）	洪水ハザードマップの作成	松野町						3	3	100.0	
C08-008	総合治水	一般	松山市	直接	松山市	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（重信川他）	洪水ハザードマップの作成	松山市						40	27	67.5	
C08-009	総合治水	一般	伊予市	直接	伊予市	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（重信川他）	洪水ハザードマップの作成	伊予市						2	3	150.0	
C08-010	総合治水	一般	東温市	直接	東温市	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（重信川）	洪水ハザードマップの作成	東温市						10	4	40.0	
C08-011	総合治水	一般	今治市	直接	今治市	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（蒼社川）	洪水ハザードマップの作成	今治市						2	2	100.0	
C08-012	総合治水	一般	宇和島市	直接	宇和島市	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（三間川他）	洪水ハザードマップの作成	宇和島市						4	4	100.0	
C08-013	総合治水	一般	新居浜市	直接	新居浜市	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（渦井川他）	洪水ハザードマップの作成	新居浜市						34	20	58.8	
C08-014	総合治水	一般	砥部町	直接	砥部町	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（重信川）	洪水ハザードマップの作成	砥部町						2	1	50.0	
C08-015	総合治水	一般	内子町	直接	内子町	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（小田川他）	洪水ハザードマップの作成	内子町						30	22	73.3	
C08-016	総合治水	一般	今治市	直接	今治市	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（頓田川他）	洪水ハザードマップの作成	今治市						12	11	91.7	
C08-017	総合治水	一般	松前町	直接	松前町	情報・河川	－	洪水ハザードマップ作成（国近川他）	洪水ハザードマップの作成、防災用資機材の整備等	松野町						6	6	100.0	
													合計			2,141	2,110		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
C08-001	水害リスク情報を整理して、住民に周知するとともに、市町の避難体制を支援する。	
C08-002	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-003	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-004	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-005	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-006	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-007	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-008	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-009	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-010	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-011	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-012	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-013	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-014	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-015	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-016	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	
C08-017	河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。	

D　社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度） R2	R3	R4	R5	R6	全体事業費（百万円）	全体事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
																		#DIV/0!	
													合計			0	0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考


※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況	
Ⅰ定量的指標に関連する 交付対象事業（各要素事業）の 効果の発現状況	・計画的な事業進捗を図ることにより、浸水の恐れのある戸数や重要水防箇所における堤防整備必要延長を大幅に現象させることができ、地域の治水安全度を向上させた。 ・地震や津波対策の事業にも随時着手し、県民の人命や財産を守るインフラを整備した。 ・県管理全てのダムについて大規模災害による電力供給停止時における連続運転72時間以上を可能とした。
Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の 発現状況 （必要に応じて記述）	・大規模な水門等の修繕については、交付金の緊急対策や個別補助に事業を移行することにより早急な対策を実施し施設の延命化に努めた。 ・河道掘削に重点的に取り組み、流域阻害となっていた土砂や樹木を撤去することにより治水安全度を向上させた。

３．特記事項（今後の方針等）
・近年頻発化している水害や今後発生が予想される南海トラフ地震から県民の人命や財産を守るため、災害につよい河川整備を実施していく。


（参考図面1）社会資本整備総合交付金

計画の名称	1　災害につよい愛顔あふれる川づくり　～洪水・地震・津波による河川災害から命を守る～　（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度　～　令和6年度　（5年間）	交付対象	愛媛県、西条市、松山市、松前町、八幡浜市、宇和島市、松野町、伊予市、東温市、今治市、新居浜市、砥部町、内子町

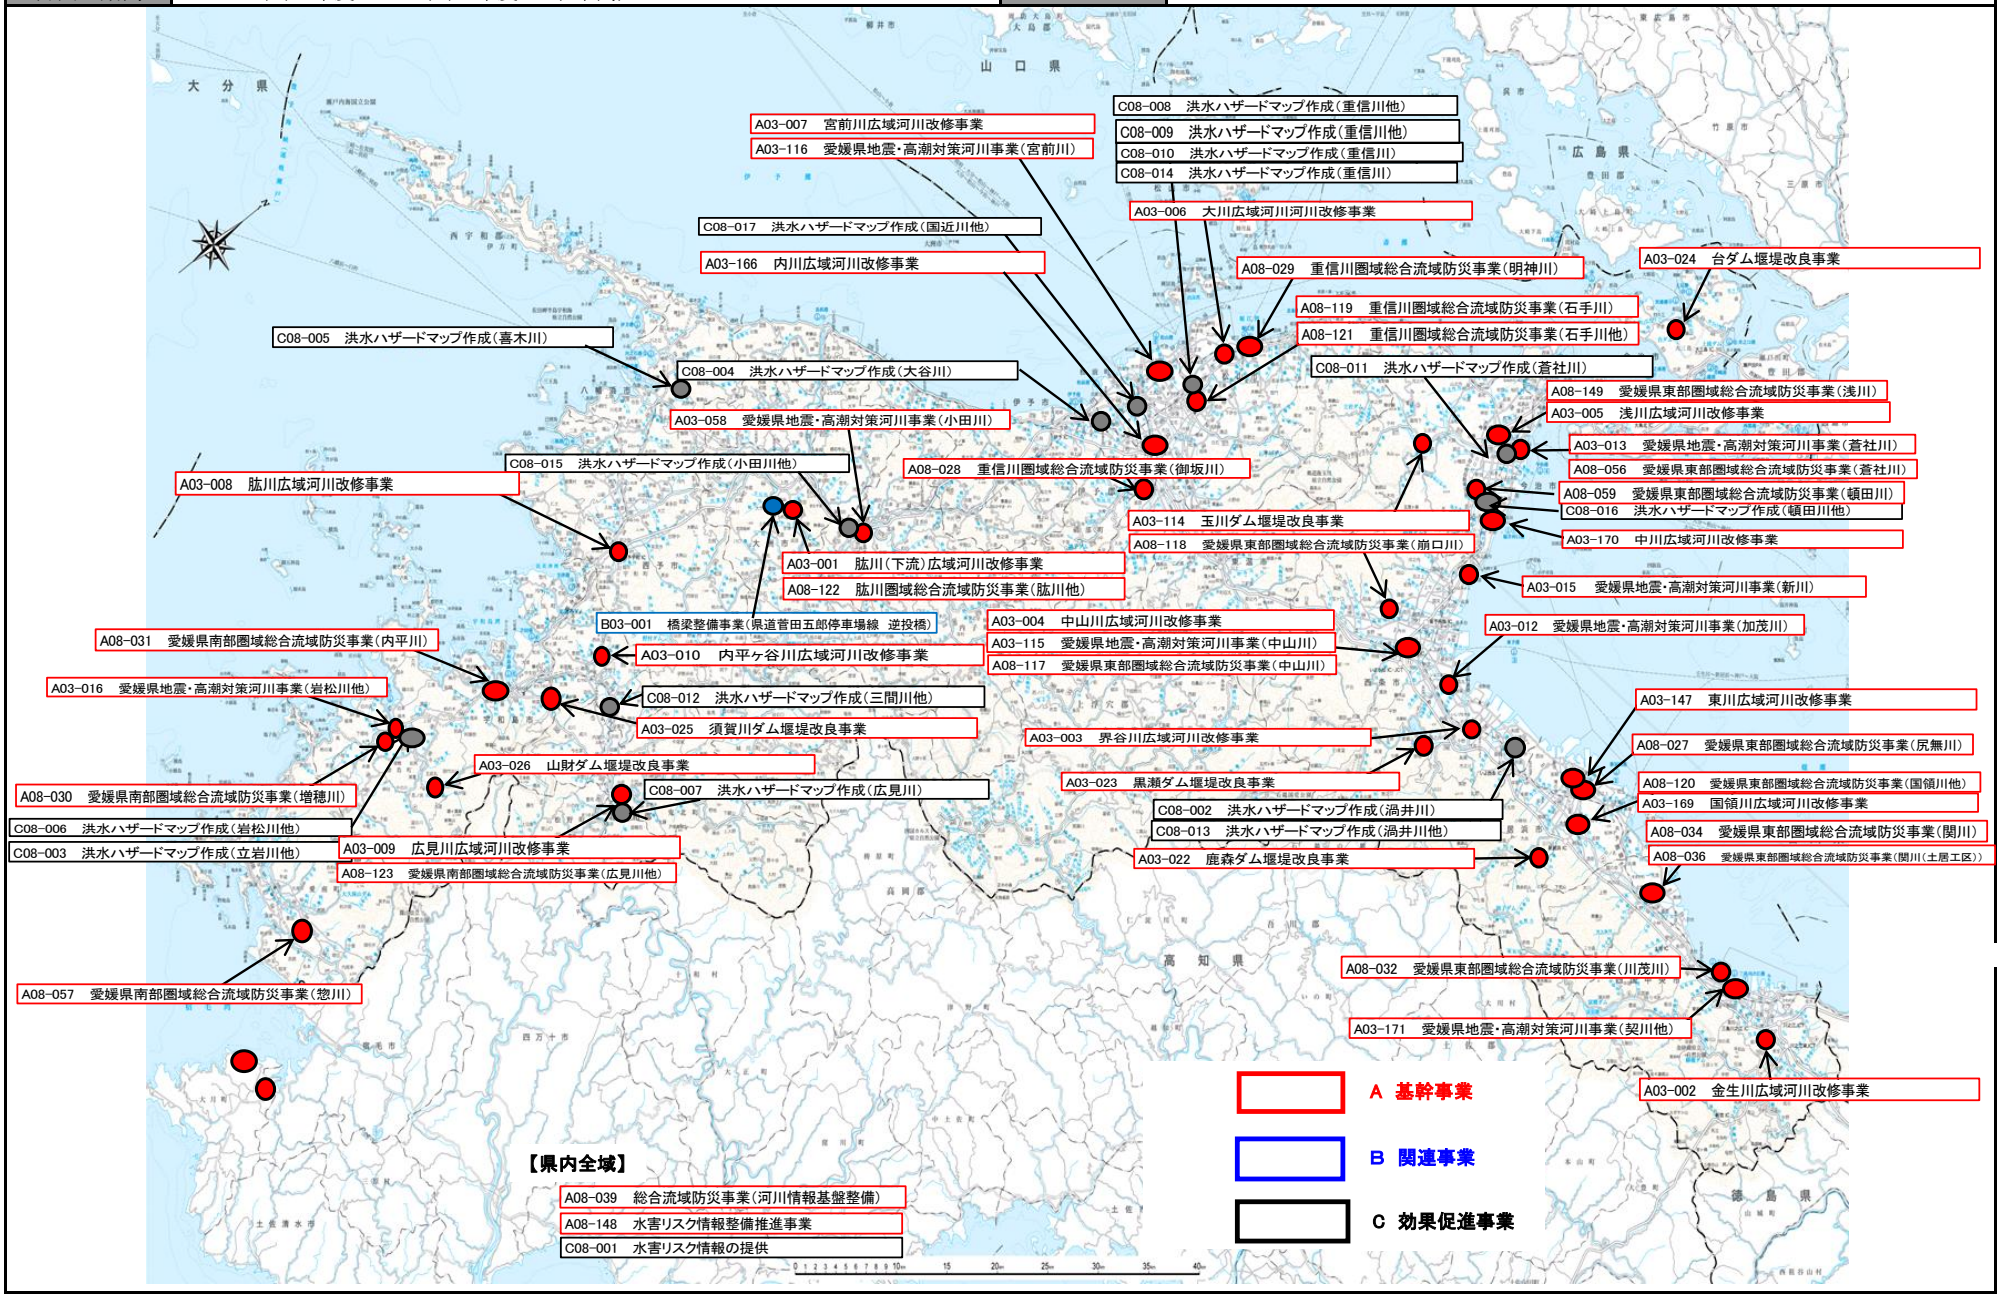

（参考図面2）社会資本整備総合交付金

計画の名称	1　災害につよい愛顔あふれる川づくり　～洪水・地震・津波による河川災害から命を守る～　（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度　～　令和6年度　（5年間）	交付対象	愛媛県、西条市、松山市、松前町、八幡浜市、宇和島市、松野町、伊予市、東温市、今治市、新居浜市、砥部町、内子町

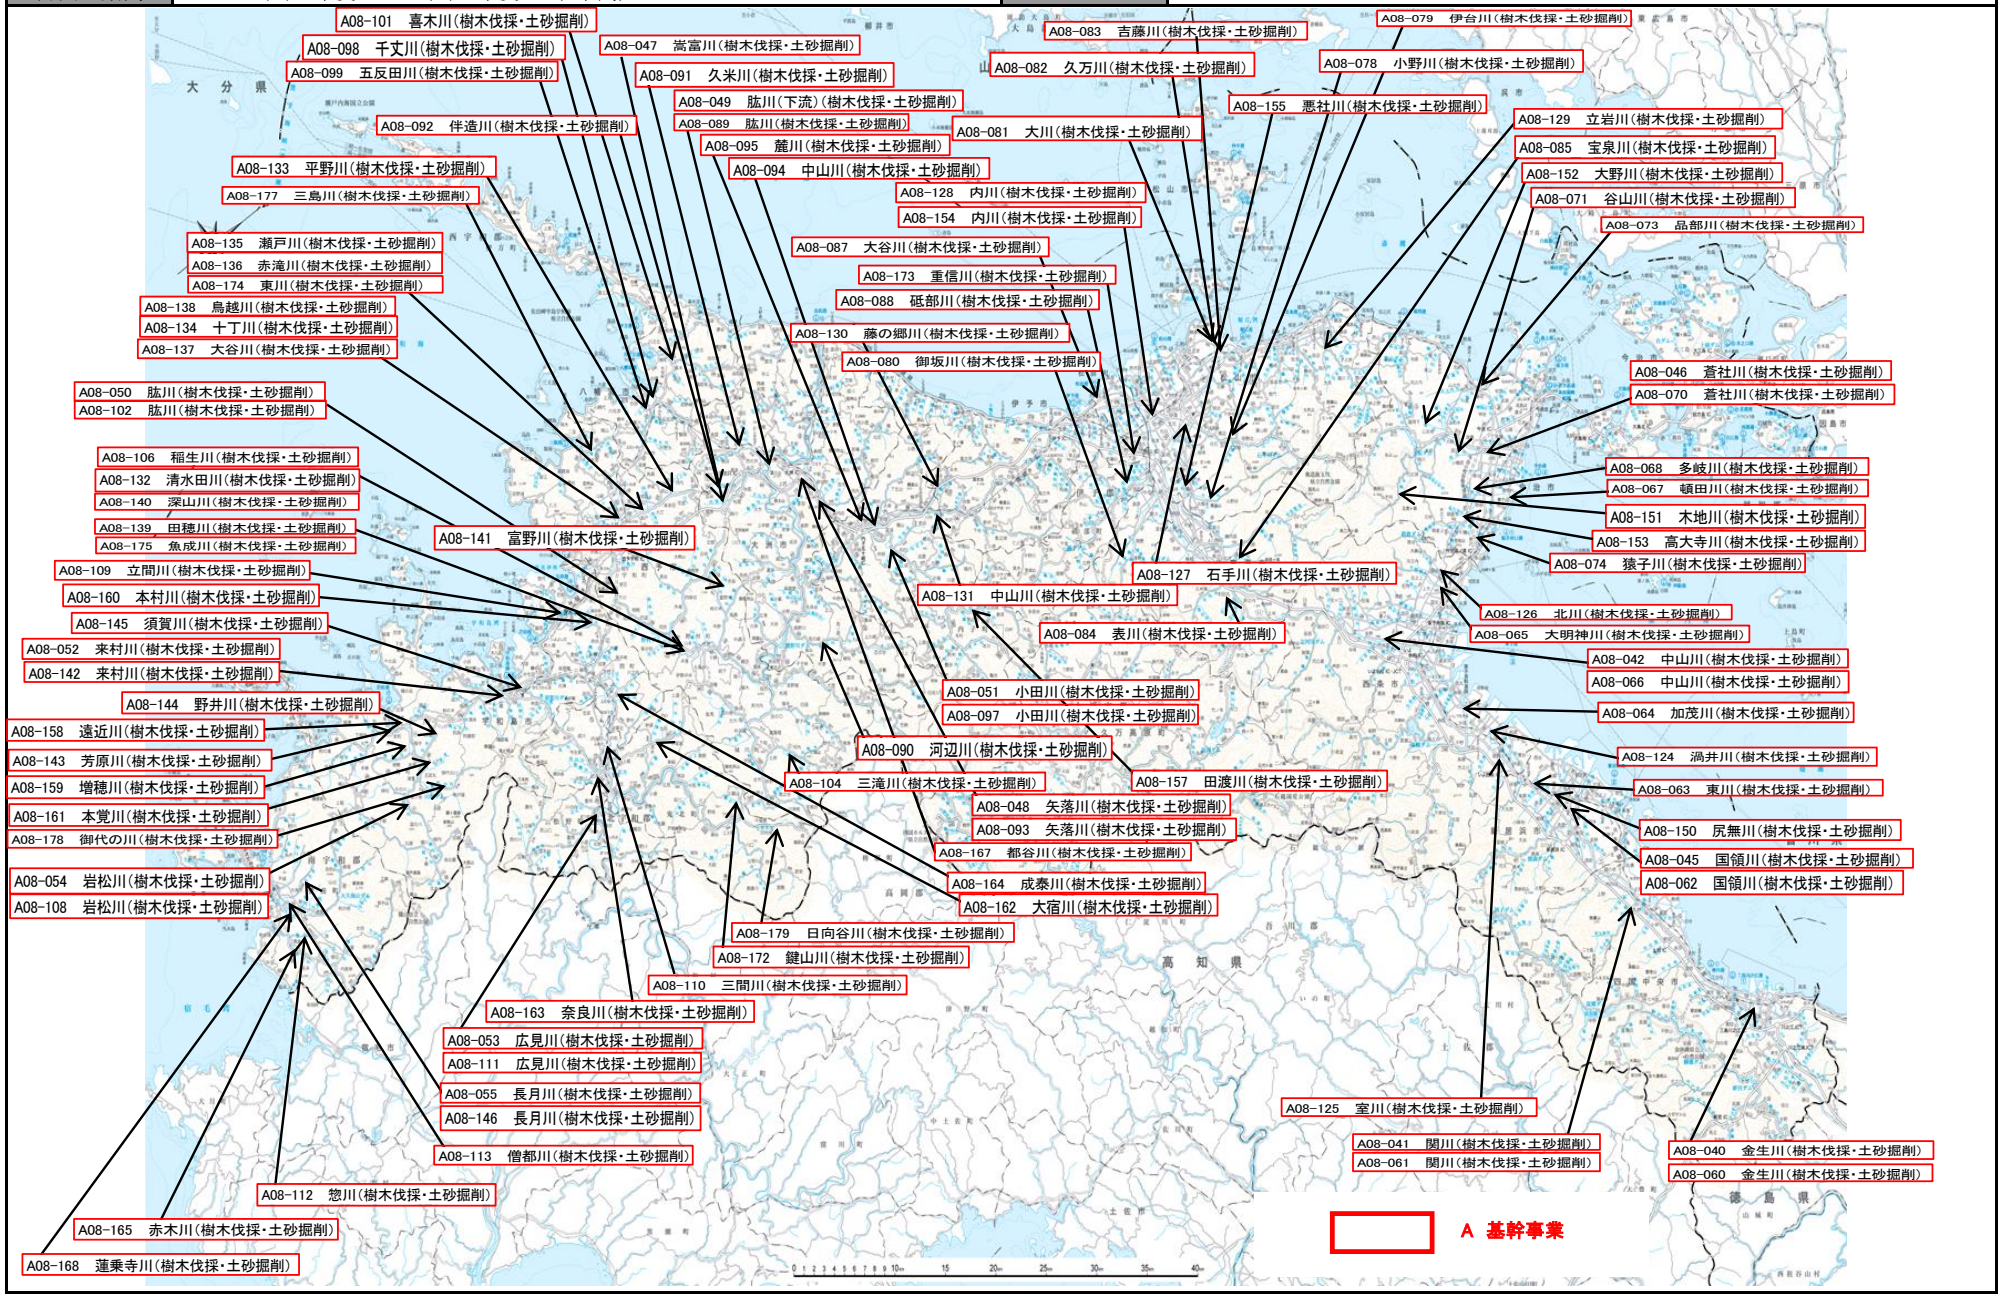

事業概要

概要説明

崩口川　総合流域防災事業

崩口川は、西条市内を流れる二級河川であり、最下流は東予港付近の近隣に位置する。
既設護岸の改修はほとんどされてなく老朽化した石積みや土羽が多いことから、護岸の修繕や補強を行うことにより災害につよい河川整備を推進した。





概要説明

内平ヶ谷川　広域河川改修事業

内平ヶ谷川は、高森山から東に延びる標高700m前後の山脈に源を発し、宇和島市三間町宮ノ下で三間川に合流する河川であり、流域面積6km2、流路延長約5kmの一級河川である。
平成2年より広域河川改修事業を進捗しており、護岸拡幅や横断工作物の改築を行うことにより治水安全度の向上が図られた。



