# 社会資本総合整備計画　事後評価書

計画名：土砂災害につよい愛ある県土づくり（重点）　～急峻・脆弱な愛媛の地形地質から命をまもる～

砂防課

（参考）　社会資本総合整備計画　事後評価書~~（中間評価書）~~

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 計画の名称 | 1　土砂災害につよい愛ある県土づくり（重点）　～急峻・脆弱な愛媛の地形地質から命をまもる～ | | |
| 計画の期間 | 令和2年度　～　令和6年度　（5年間） | 交付対象 | 愛媛県 |
| 計画の目標 | 愛媛県は、県土の約８割が急峻な山地で、中央構造線など大規模な構造線の影響による脆弱な地質構造であり、15,190箇所にも及ぶ土砂災害危険箇所を抱え、頻繁に発生する土砂災害に対して、ハード・ソフトが一体となった土砂災害対策を推進することにより、土砂災害に強い県土をつくり、安全安心な県民生活を確保する。 | | |

計画の成果目標（定量的指標）

・保全人家50戸以上の箇所の土砂災害対策を推進することにより保全される人家が、619戸（R2）から1,819戸（R6）に増加。（新たに1,200戸を保全）
・土砂災害のおそれのある要配慮者利用施設（24時間滞在型）22施設を保全する箇所に着手。

| 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値（R2当初） | 中間目標値（R4末） | 最終目標値（R6末） | 達成率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 土砂災害対策により保全される人家戸数<br>目標値：<br>実績値： | 619戸 | 1270戸 | 1819戸<br>1444戸 | 79% | ハード整備にあたり、相続等の関係で用地取得に時間を要し、計画期間内に事業完了ができなかったため。 |
| ② 土砂災害対策に着手する箇所の要配慮者利用施設数（24時間滞在型）<br>目標値：<br>実績値： | 15施設 | 30施設 | 37施設<br>18施設 | 48% | ハード整備予定箇所において地元調整等に難航し、事業着手できなかったため。 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体事業費（計画） | 合計（A＋B＋C＋D） | 8,424百万円 | A | 6,350百万円 | B | 00百万円 | C | 00百万円 | D | 2,074百万円 | 効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C＋D） | 0.0% | 進捗率（実施事業費/全体事業費） | 85.9% |
| 実施事業費（最終） | 合計（A＋B＋C＋D） | 7,237百万円 | A | 5,163百万円 | B | 00百万円 | C | 00百万円 | D | 2,074百万円 | 効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C＋D） | 0.0% | | |

**1．交付対象事業**

A1　砂防事業

| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名（事業箇所） | 事業内容（延長・面積等） | 市町村名 | 事業実施期間（年度） R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 全体事業費（百万円） | 実施事業費（百万円） | 進捗率（%） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A04-001 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 鎌谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 四国中央市 | | | | | | 5 | 0 | 0.0 | |
| A04-002 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 谷奥川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 四国中央市 | | | | | | 10 | 48 | 480.0 | |
| A04-003 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 東町川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 四国中央市 | | | | | | 70 | 75 | 107.1 | |
| A04-004 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 根々見谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 四国中央市 | | | | | | 30 | 6 | 20.0 | |
| A04-005 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 前神寺谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 西条市 | | | | | | 10 | 127 | 1,270.0 | |
| A04-006 | 砂防 | 離島 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 上野川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 新居浜市 | | | | | | 60 | 27 | 45.0 | |
| A04-007 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 米山川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 西条市 | | | | | | 35 | 0 | 0.0 | |
| A04-008 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 宗方本川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | 2 | 294 | 14,700.0 | |
| A04-009 | 砂防 | 離島 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 高原川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 上島町 | | | | | | 20 | 36 | 180.0 | |
| A04-010 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 原川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | 530 | 35 | 6.6 | |
| A04-011 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 坊主谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | 10 | 77 | 770.0 | |
| A04-012 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 古江川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | 5 | 183 | 3,660.0 | |
| A04-013 | 砂防 | 離島 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 由之左近川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 上島町 | | | | | | 10 | 151 | 1,510.0 | |
| A04-014 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 西宗方川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | 50 | 0 | 0.0 | |
| A04-015 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 丸田川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | 50 | 0 | 0.0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A04-016 | 砂防 | 離島 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 古殿川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 上島町 | | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | |
| A04-017 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 下谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | |
| A04-018 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 扇谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-019 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 竹谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-020 | 砂防 | 離島 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 東高原川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 上島町 | | | | | | | 5 | 127 | 2,540.0 | |
| A04-021 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 園地川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | |
| A04-022 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | イモホリ川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | |
| A04-023 | 砂防 | 離島 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | イキマサ川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 松山市 | | | | | | | 40 | 167 | 417.5 | |
| A04-024 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 小川谷通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 松山市 | | | | | | | 10 | 35 | 350.0 | |
| A04-025 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 別府川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 東温市 | | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-026 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 二瀬川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 伊予市 | | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-027 | 砂防 | 離島 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 行出田川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 松山市 | | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-028 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | スルス川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 砥部町 | | | | | | | 78 | 0 | 0.0 | |
| A04-029 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 畑寺2号谷通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 松山市 | | | | | | | 17 | 0 | 0.0 | |
| A04-030 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 左ビキイシ谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 久万高原町 | | | | | | | 27 | 256 | 948.1 | |
| A04-031 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 今戸川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 久万高原町 | | | | | | | 140 | 203 | 145.0 | |
| A04-032 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 畑谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 内子町 | | | | | | | 50 | 26 | 52.0 | |
| A04-033 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 樽奥谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 内子町 | | | | | | | 50 | 60 | 120.0 | |
| A04-034 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 久保川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 伊方町 | | | | | | | 145 | 83 | 57.2 | |
| A04-035 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 寺川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 伊方町 | | | | | | | 60 | 0 | 0.0 | |
| A04-036 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 川之浜ツル川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 伊方町 | | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | |
| A04-037 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 鬼窪川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 西予市 | | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | |
| A04-038 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 西川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 西予市 | | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | 箇所番号(Y445-1310) |
| A04-039 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 西川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 西予市 | | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | 箇所番号(Y445-1301) |
| A04-040 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 宇和島市 | | | | | | | 110 | 0 | 0.0 | |
| A04-041 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 稲葉川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 宇和島市 | | | | | | | 120 | 73 | 60.8 | |
| A04-042 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 百の浦川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 宇和島市 | | | | | | | 20 | 22 | 110.0 | |
| A04-043 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 畑枝川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 宇和島市 | | | | | | | 50 | 149 | 298.0 | |
| A04-044 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 木原川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 宇和島市 | | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-045 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 大日提川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 宇和島市 | | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-046 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 大寿浦通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 愛南町 | | | | | | | 60 | 101 | 168.3 | |
| A04-047 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 大駄川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 愛南町 | | | | | | | 60 | 0 | 0.0 | |
| A04-086 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | 女体川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 内子町 | | | | | | | 50 | 21 | 42.0 | |
| A04-087 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | － | カルト川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 久万高原町 | | | | | | | 50 | 14 | 28.0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A04-088 | 砂防 | 離島 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 南明神川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 越智郡上島町弓削 | | | | | | 17 | 36 | 211.8 | |
| A04-089 | 砂防 | 離島 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 明神川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 越智郡上島町弓削 | | | | | | 100 | 17 | 17.0 | |
| A04-090 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 大平川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 伊予市 | | | | | | 5 | 0 | 0.0 | |
| A04-091 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 風呂の奥川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 砥部町 | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-092 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 七津川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 内子町 | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-093 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 添谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 四国中央市 | | | | | | 60 | 0 | 0.0 | |
| A04-094 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 平尾川上川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | 50 | 0 | 0.0 | |
| A04-095 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 駄場下川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 八幡浜市 | | | | | | 50 | 0 | 0.0 | |
| A04-096 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 下高串川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 宇和島市 | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | |
| A04-097 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 地蔵谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 四国中央市土居町 | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | |
| A04-098 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 下林3号谷通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 東温市下林 | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-099 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 高尾川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 新居浜市大永山 | | | | | | 26 | 0 | 0.0 | |
| A04-100 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 宮谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 四国中央市土居町 | | | | | | 7 | 0 | 0.0 | |
| A04-101 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | フクガタニ川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 西条市丹原町志川 | | | | | | 10 | 29 | 290.0 | |
| A04-102 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 下芋地西川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 宇和島市津島町岩 | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-103 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 松の元川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 西予市宇和町野田 | | | | | | 50 | 0 | 0.0 | |
| A04-104 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 家次川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 宇和島市津島町北 | | | | | | 64 | 0 | 0.0 | |
| A04-105 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 西延川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 北宇和郡鬼北町大 | | | | | | 70 | 0 | 0.0 | |
| A04-106 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 南谷川3通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市玉川町長谷 | | | | | | 5 | 0 | 0.0 | |
| A04-107 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 萱が谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 喜多郡内子町大久 | | | | | | 34 | 24 | 70.6 | |
| A04-108 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 脇田川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 南宇和郡愛南町柏 | | | | | | 45 | 0 | 0.0 | |
| A04-109 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 西延川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市玉川町法界 | | | | | | 61 | 0 | 0.0 | |
| A04-110 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | ハシカタニ川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市玉川町長谷 | | | | | | 5 | 46 | 920.0 | |
| A04-111 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 豊谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 喜多郡内子町寺村 | | | | | | 55 | 0 | 0.0 | |
| A04-112 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 西野田川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 大洲市新谷 | | | | | | 50 | 20 | 40.0 | |
| A04-113 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 東野田川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 大洲市新谷 | | | | | | 50 | 18 | 36.0 | |
| A04-114 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 西宿の浦川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 宇和島市蒋渕 | | | | | | 50 | 0 | 0.0 | |
| A04-115 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 大久保川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | 77 | 0 | 0.0 | |
| A04-116 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 西国道川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-117 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 隅谷川上川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市 | | | | | | 51 | 0 | 0.0 | |
| A04-118 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 先新浜川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 宇和島市 | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-119 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | ウルメ川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 西条市他 | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A04-120 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 植松川他通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 今治市他 | | | | | | 10 | 29 | 290.0 | |
| A04-121 | 砂防 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 通常砂防 | ― | 奥ノ山川他通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 松山市他 | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小計（砂防事業） | 3,491 | 2,615 | |
| A2　急傾斜地崩壊対策事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 | 事業内容（延長・面積・水深等） | 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費（百万円） | 実施事業費（百万円） | 進捗率（%） | 備考 |
| | | | | | | | | | | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | |
| A06-048 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 名草谷地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 四国中央市 | | | | | | 25 | 0 | 0.0 | |
| A06-049 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 西の土居A地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 新居浜市 | | | | | | 60 | 141 | 235.0 | |
| A06-050 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 下田水地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 今治市 | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | |
| A06-051 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 平和通地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 松山市 | | | | | | 20 | 32 | 160.0 | |
| A06-052 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 里地地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 砥部町 | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | |
| A06-053 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 大内野地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 砥部町 | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A06-054 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 本村地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 大洲市 | | | | | | 30 | 0 | 0.0 | |
| A06-055 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 落合地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 内子町 | | | | | | 10 | 0 | 0.0 | |
| A06-056 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 迫田B地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 八幡浜市 | | | | | | 30 | 43 | 143.3 | |
| A06-057 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 中ノ浦地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 西予市 | | | | | | 10 | 9 | 90.0 | |
| A06-058 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 皆江地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 西予市 | | | | | | 90 | 164 | 182.2 | |
| A06-059 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 妙典寺前D地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 宇和島市 | | | | | | 85 | 73 | 85.9 | |
| A06-060 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 本九島地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 宇和島市 | | | | | | 80 | 60 | 75.0 | |
| A06-061 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 伊吹北D地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 宇和島市 | | | | | | 50 | 0 | 0.0 | |
| A06-062 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 藤江A地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 宇和島市 | | | | | | 90 | 145 | 161.1 | |
| A06-063 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 御殿内地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 宇和島市 | | | | | | 30 | 33 | 110.0 | |
| A06-064 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 港町地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 宇和島市 | | | | | | 30 | 30 | 100.0 | |
| A06-065 | 急傾斜 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | － | － | 丸之内A地区急傾斜地崩壊対策事業 | 擁壁工 | 宇和島市 | | | | | | 445 | 398 | 89.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 小計（急傾斜地崩壊対策事業） | 1,155 | 1,128 | | |
| A3　その他総合的な治水事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 | 事業内容（延長・面積・水深等） | 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費（百万円） | 実施事業費（百万円） | 進捗率（%） | 備考 |
| | | | | | | | | | | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | |
| A08-066 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 浦山川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 | | | | | | 30 | 57 | 190.0 | |
| A08-067 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 堀子川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 | | | | | | 49 | 0 | 0.0 | |
| A08-068 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 西谷川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 | | | | | | 40 | 99 | 247.5 | |
| A08-069 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 面白川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 | | | | | | 90 | 93 | 103.3 | |
| A08-070 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 大地川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 | | | | | | 50 | 78 | 156.0 | |
| A08-071 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 多領須川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 | | | | | | 50 | 4 | 8.0 | |
| A08-072 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 細谷川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 | | | | | | 50 | 9 | 18.0 | |
| A08-073 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 大川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 今治市 | | | | | | 49 | 42 | 85.7 | |
| A08-074 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 国道川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 上島町 | | | | | | 60 | 44 | 73.3 | |
| A08-075 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | ノウ谷川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 久万高原町 | | | | | | 66 | 7 | 10.6 | |
| A08-076 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 小松谷川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 久万高原町 | | | | | | 13 | 49 | 376.9 | |
| A08-077 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 前川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 久万高原町 | | | | | | 93 | 33 | 35.5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A08-078 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 岡村開地地区外総合流域防災事業 | 緊急改築 | 今治市、上島町 | | | | | | 275 | 275 | 100.0 | |
| A08-079 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 長早西地区外総合流域防災事業 | 緊急改築 | 西予市、八幡浜市、伊方町 | | | | | | 205 | 205 | 100.0 | |
| A08-080 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 水荷浦地区外総合流域防災事業 | 緊急改築 | 宇和島市 | | | | | | 84 | 84 | 100.0 | |
| A08-081 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 愛媛東部圏域総合流域防災事業 | 長寿命化計画策定 | 圏域内市町 | | | | | | 150 | 78 | 52.0 | |
| A08-082 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 重信川圏域総合流域防災事業 | 長寿命化計画策定 | 圏域内市町 | | | | | | 50 | 26 | 52.0 | |
| A08-083 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 面河川圏域総合流域防災事業 | 長寿命化計画策定 | 圏域内市町 | | | | | | 50 | 39 | 78.0 | |
| A08-084 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 肱川圏域総合流域防災事業 | 長寿命化計画策定 | 圏域内市町 | | | | | | 150 | 119 | 79.3 | |
| A08-085 | 総合治水 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | 砂防等 | － | 愛媛南部圏域総合流域防災事業 | 長寿命化計画策定 | 圏域内市町 | | | | | | 100 | 79 | 79.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 小計（その他総合的な治水事業） | | 1,704 | 1,420 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 合計 | | 6,350 | 5,163 | | |

B　関連社会資本整備事業

| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 | 事業内容（延長・面積等） | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 全体事業費（百万円） | 実施事業費（百万円） | 進捗率（%） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 合計 | 0 | 0 | | |

| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | 備考 |
|---|---|---|---|
| | | | |

C　効果促進事業

| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 全体事業費（百万円） | 全体事業費（百万円） | 進捗率（%） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | 合計 | | | 0 | 0 | | |

| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | 備考 |
|---|---|---|
| | | |

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 全体事業費（百万円） | 全体事業費（百万円） | 進捗率（%） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D18-001 | 地籍整備 | 一般 | 愛媛県 | 間接 | 松山市 | － | － | 地籍調査（太山寺地区他） | 面積 15.13km2 | 松山市 | | | | | | 322 | 319 | 99.1 | |
| D18-002 | 地籍整備 | 一般 | 愛媛県 | 間接 | 宇和島市 | － | － | 地籍調査（下畑地の第15他） | 面積 13.74km2 | 宇和島市 | | | | | | 588 | 589 | 100.2 | |
| D18-003 | 地籍整備 | 一般 | 愛媛県 | 間接 | 八幡浜市 | － | － | 地籍調査（産業通・古町二丁目他） | 面積 1.81km2 | 八幡浜市 | | | | | | 177 | 178 | 100.6 | |
| D18-004 | 地籍整備 | 一般 | 愛媛県 | 間接 | 西条市 | － | － | 地籍調査（大保木の第２他） | 面積 4.23km2 | 西条市 | | | | | | 243 | 243 | 100.0 | |
| D18-005 | 地籍整備 | 一般 | 愛媛県 | 間接 | 大洲市 | － | － | 地籍調査　（菅田第10計画区他） | 面積 9.17km2 | 大洲市 | | | | | | 388 | 388 | 100.0 | |
| D18-006 | 地籍整備 | 一般 | 愛媛県 | 間接 | 四国中央市 | － | － | 地籍調査（川滝町下山・領家10他） | 面積 16.12km2 | 四国中央市 | | | | | | 356 | 357 | 100.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | 合計 | | | 2,074 | 2,074 | | |

| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | 備考 |
|---|---|---|
| D18-001 | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備することにより、事業実施時の円滑化を図る。 | |
| D18-002 | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備することにより、事業実施時の円滑化を図る。 | |
| D18-003 | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備することにより、事業実施時の円滑化を図る。 | |
| D18-004 | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備することにより、事業実施時の円滑化を図る。 | |
| D18-005 | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備することにより、事業実施時の円滑化を図る。 | |
| D18-006 | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備することにより、事業実施時の円滑化を図る。 | |

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

## ２．事業効果の発現状況

| | |
|---|---|
| **Ⅰ定量的指標に関連する交付対象事業（各要素事業）の効果の発現状況** | ・ハード整備を実施した結果、土砂災害から保全される人家戸数を増加させることができ、県民の生命・財産を保護することができた。<br>・ソフト対策として「土砂災害警戒区域」の指定を行った結果、住民に対し土砂災害に対する危険周知ができ、早めの避難につなげることができた。<br>・土砂災害のおそれのある要配慮者利用施設を保全するためのハード整備に着手することにより、施設の安全性が向上した。<br>・重要交通網（ＪＲ、高速道路、国道）を保全する箇所のハード整備に着手することにより、豪雨時等における交通の安全性が向上した。 |
| **Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）** | |

## ３．特記事項（今後の方針等）

・次期社会資本総合整備計画（R7-R11）においても、ハード・ソフト一体となった土砂災害対策に取組み、県民の安全・安心な暮らしを実現する。

# （参考図面）社会資本整備総合交付金

| | | | |
|---|---|---|---|
| 計画の名称 | 1　土砂災害につよい愛ある県土づくり（重点）　～急峻・脆弱な愛媛の地形地質から命をまもる～ | | |
| 計画の期間 | 令和2年度　～　令和6年度　（5年間） | 交付対象 | 愛媛県 |

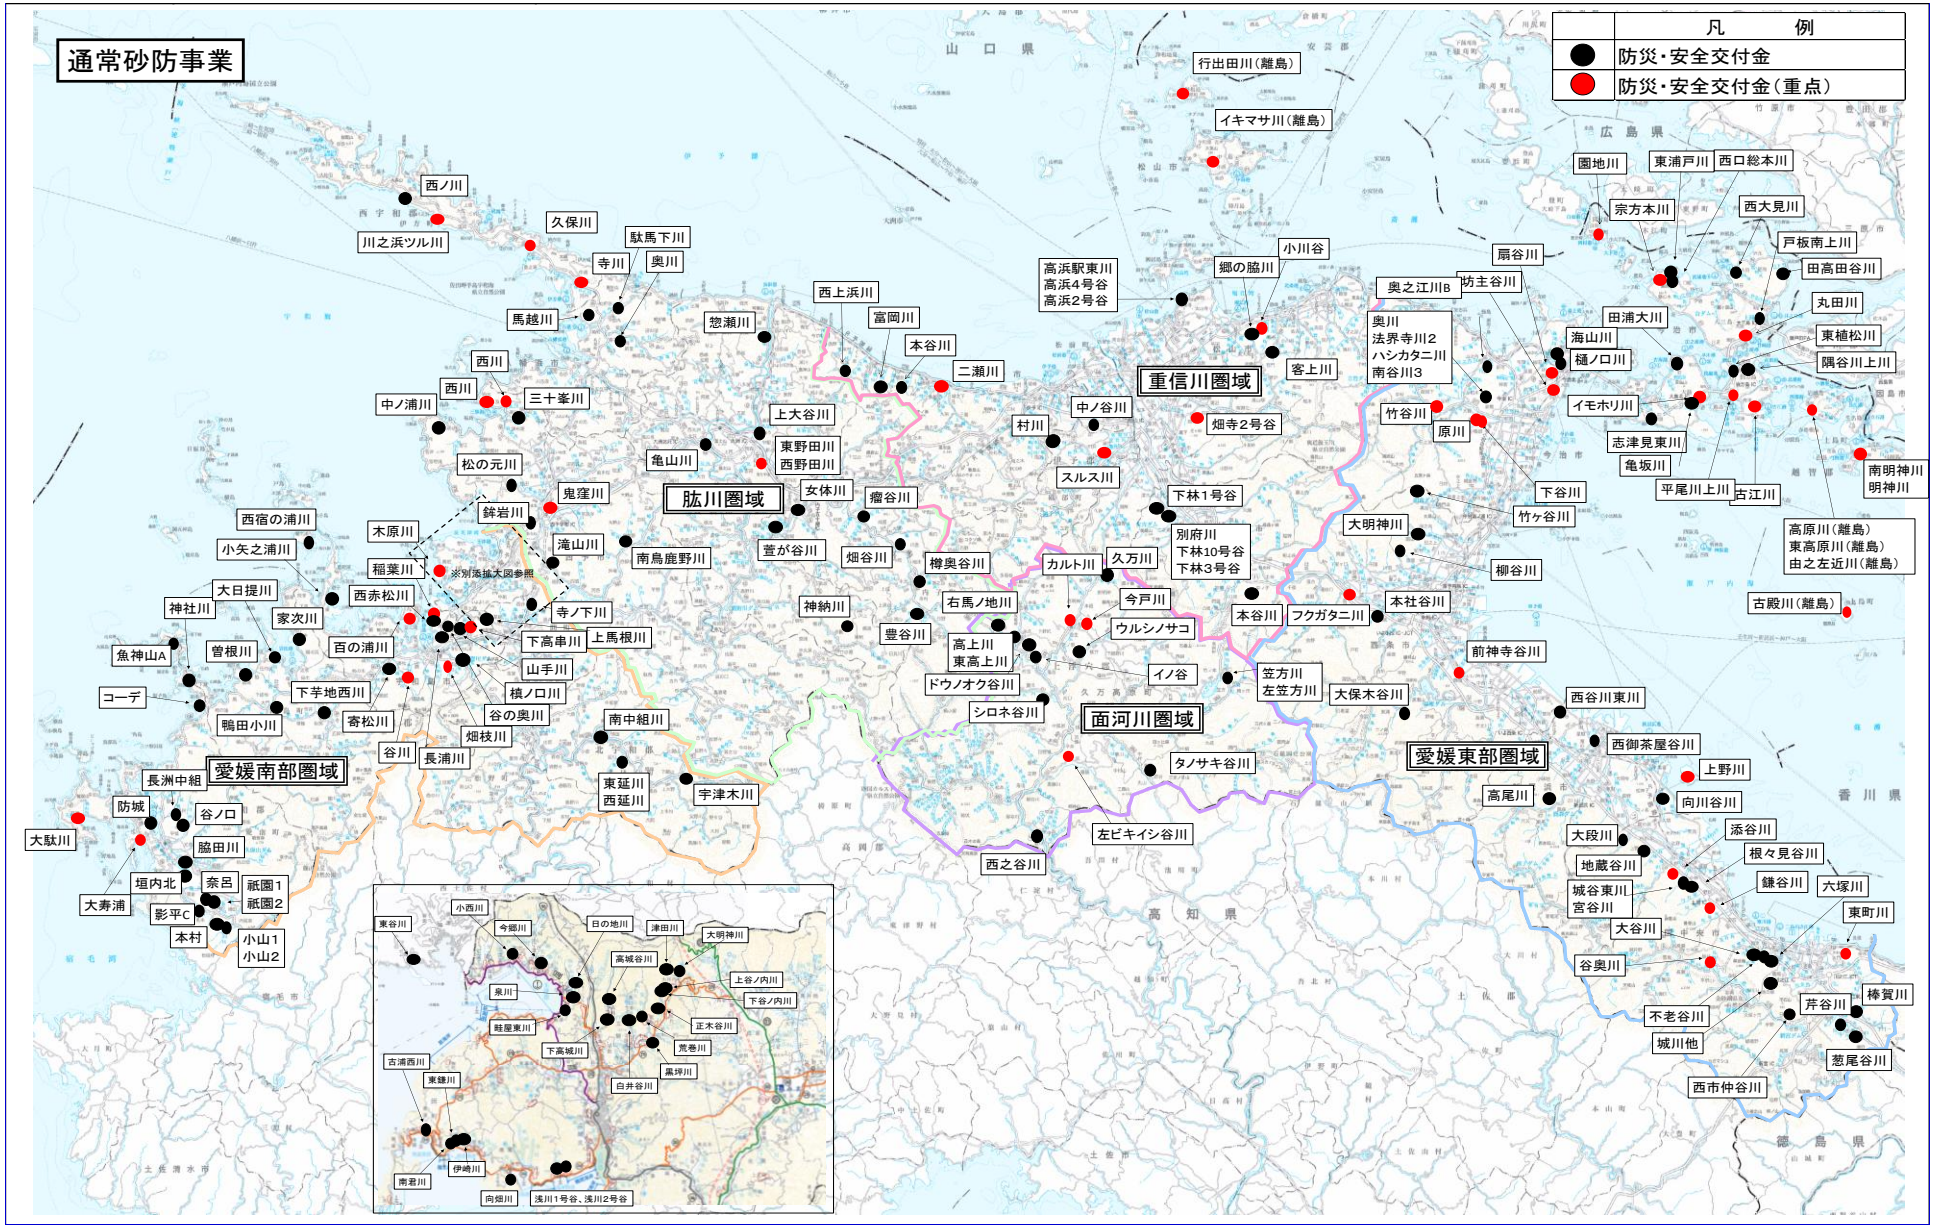

# 急傾斜地崩壊対策事業

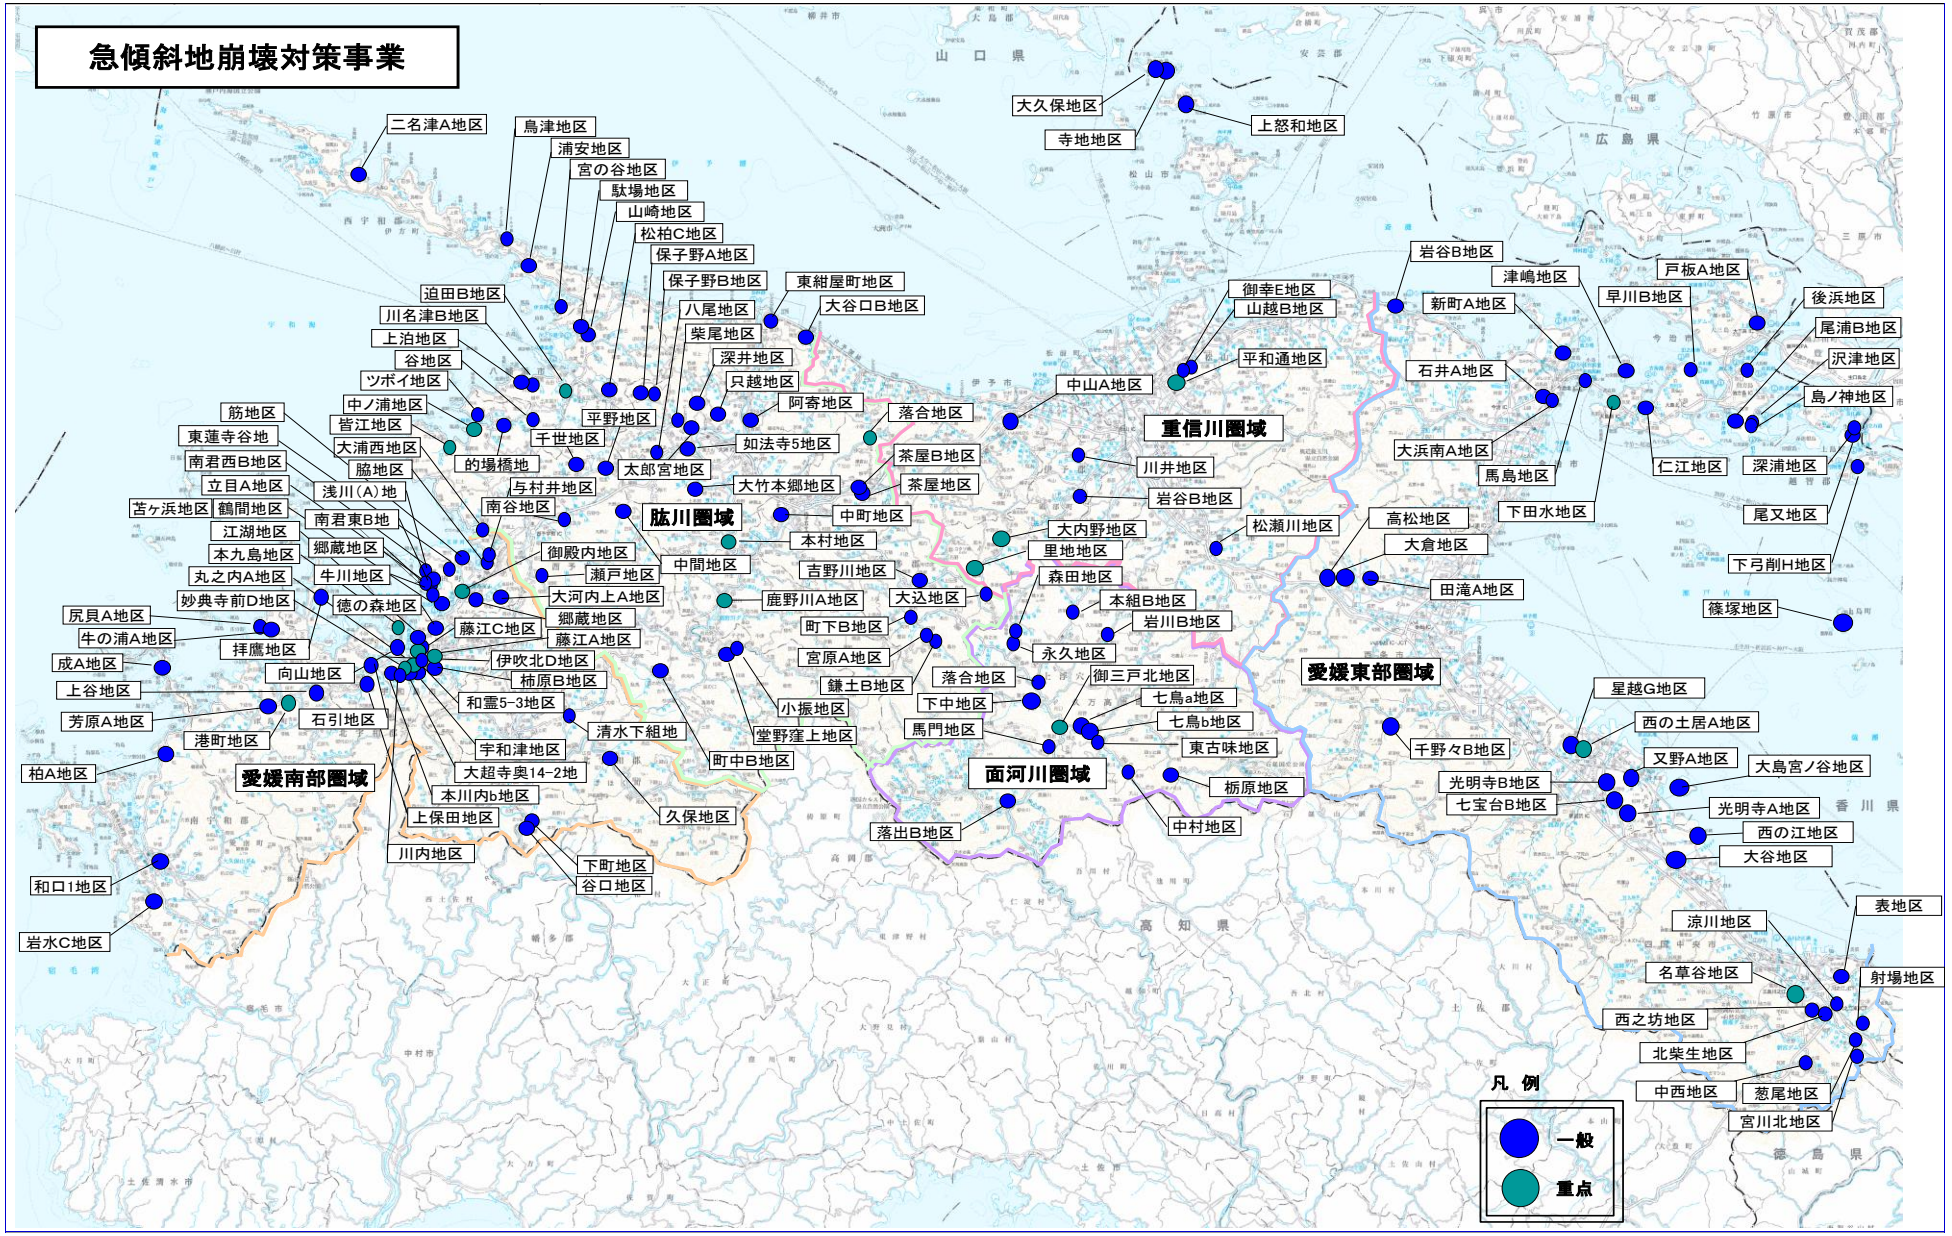

二名津A地区
鳥津地区
浦安地区
宮の谷地区
駄場地区
山崎地区
松柏C地区
保子野A地区
保子野B地区
東紺屋町地区
大谷口B地区
八尾地区
柴尾地区
深井地区
只越地区
阿寄地区
迫田B地区
川名津B地区
上泊地区
谷地区
ツボイ地区
中ノ浦地区
皆江地区
大浦西地区
脇地区
的場橋地
千世地区
平野地区
太郎宮地区
如法寺5地区
落合地区
茶屋B地区
茶屋地区
大竹本郷地区
中町地区
本村地区
中間地区
筋地区
東蓮寺谷地
南君西B地区
立目A地区
浅川(A)地
苫ヶ浜地区
鶴間地区
南君東B地
江湖地区
本九島地区
丸之内A地区
牛川地区
妙典寺前D地区
徳の森地区
尻貝A地区
牛の浦A地区
拝鷹地区
成A地区
上谷地区
向山地区
芳原A地区
石引地区
港町地区
柏A地区
愛媛南部圏域
和口1地区
岩水C地区
与村井地区
南谷地区
御殿内地区
瀬戸地区
大河内上A地区
郷蔵地区
藤江C地区
藤江A地区
伊吹北D地区
柿原B地区
和霊5-3地区
清水下組地
宇和津地区
大超寺奥14-2地
本川内b地区
上保田地区
川内地区
下町地区
谷口地区
久保地区
町中B地区
堂野窪上地区
小振地区
鹿野川A地区
吉野川地区
大込地区
町下B地区
宮原A地区
鎌土B地区
落合地区
下中地区
馬門地区
落出B地区
中村地区
栃原地区
面河川圏域
大久保地区
寺地地区
上怒和地区
御幸E地区
山越B地区
平和通地区
中山A地区
重信川圏域
川井地区
岩谷B地区
大内野地区
里地地区
森田地区
本組B地区
岩川B地区
永久地区
御三戸北地区
七鳥a地区
七鳥b地区
東古味地区
松瀬川地区
高松地区
大倉地区
田滝A地区
愛媛東部圏域
千野々B地区
岩谷B地区
津嶋地区
新町A地区
石井A地区
大浜南A地区
馬島地区
下田水地区
早川B地区
戸板A地区
後浜地区
尾浦B地区
沢津地区
島ノ神地区
仁江地区
深浦地区
尾又地区
下弓削H地区
篠塚地区
星越G地区
西の土居A地区
又野A地区
大島宮ノ谷地区
光明寺B地区
七宝台B地区
光明寺A地区
西の江地区
大谷地区
表地区
涼川地区
名草谷地区
射場地区
西之坊地区
北柴生地区
中西地区
葱尾地区
宮川北地区
山口県
広島県
香川県
高知県
凡例
一般
重点

# 総合流域防災事業

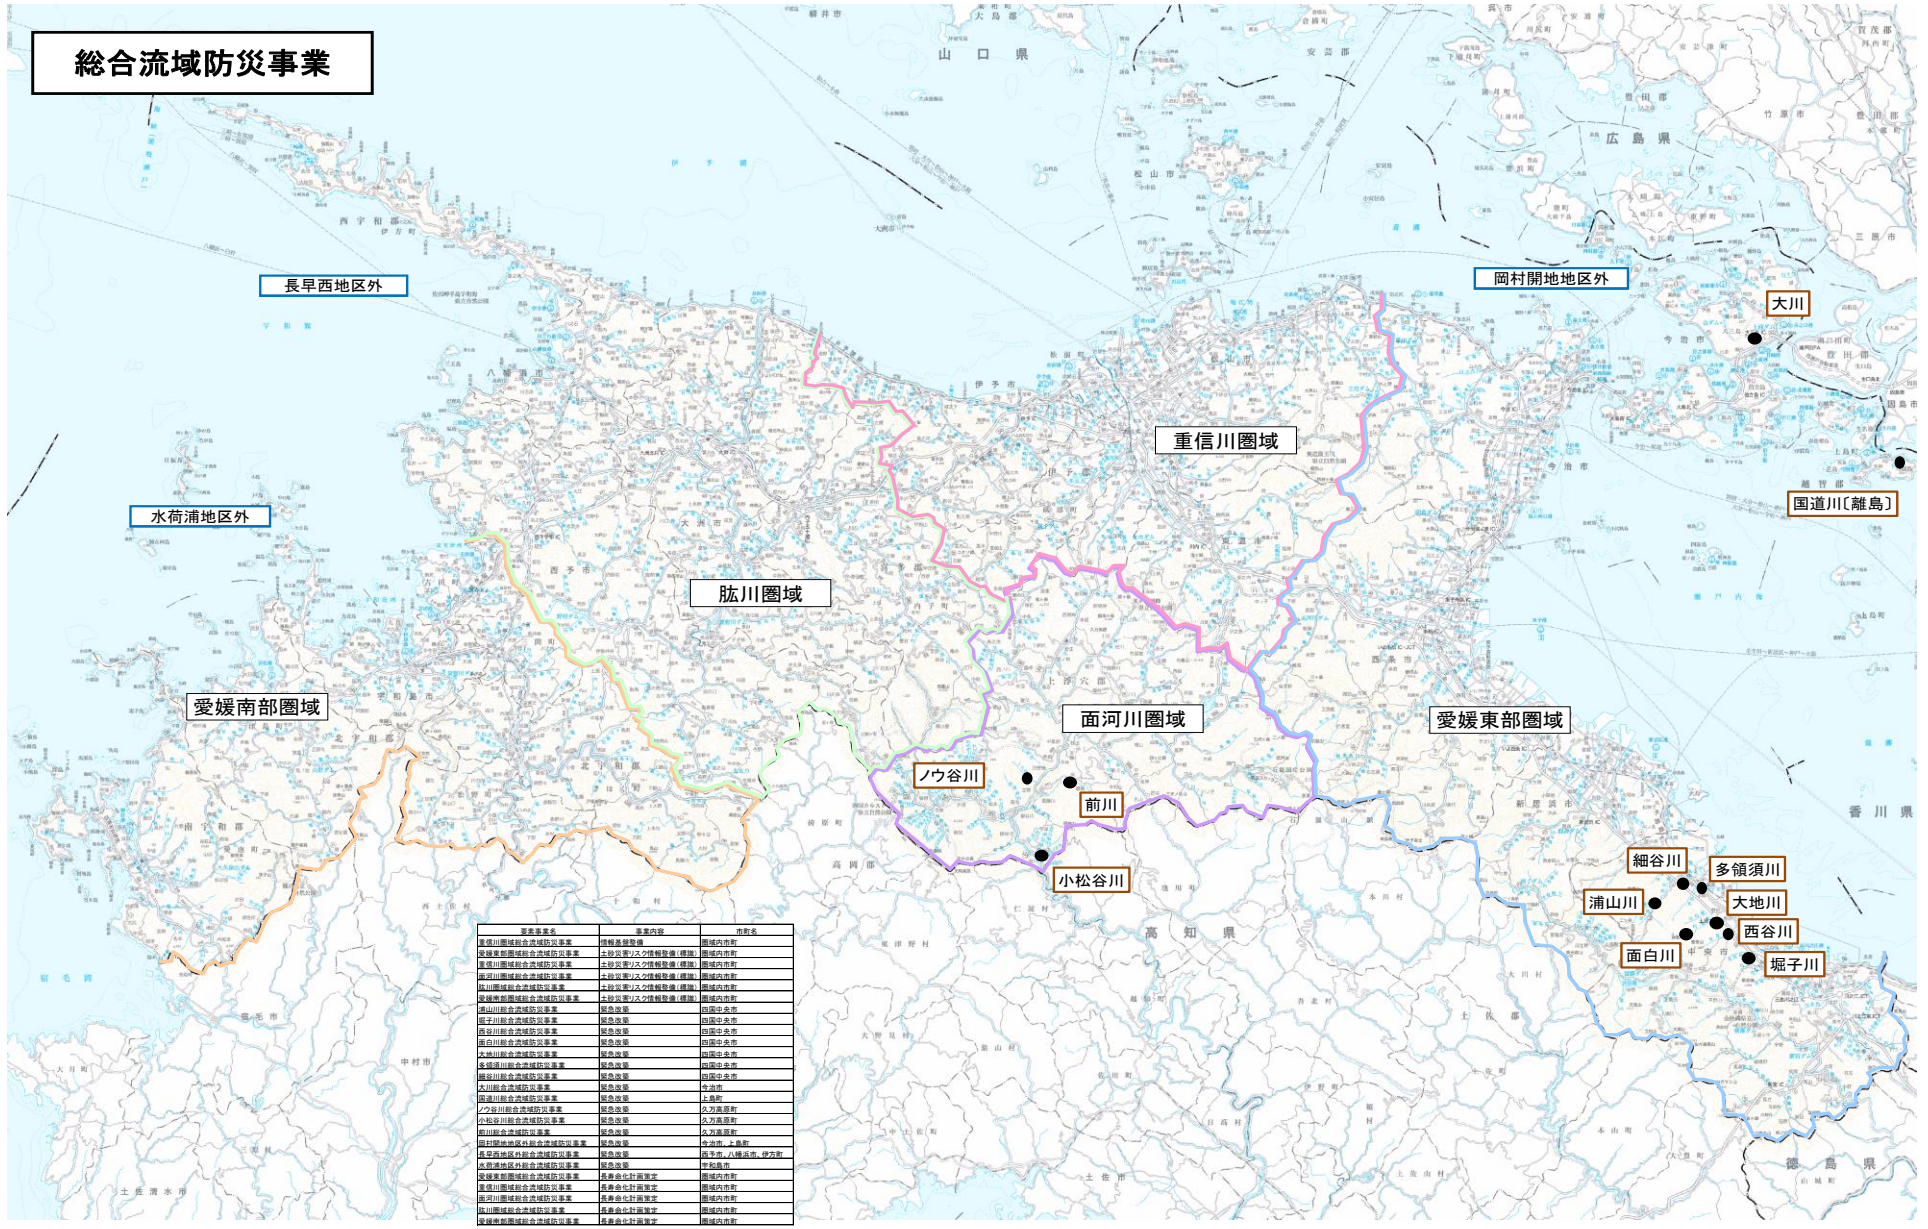


| 要美事業名 | 事業内容 | 市町名 |
|---|---|---|
| 重信川圏域総合流域防災事業 | 情報基盤整備 | 圏域内市町 |
| 愛媛東部圏域総合流域防災事業 | 土砂災害リスク情報整備（標識） | 圏域内市町 |
| 重信川圏域総合流域防災事業 | 土砂災害リスク情報整備（標識） | 圏域内市町 |
| 面河川圏域総合流域防災事業 | 土砂災害リスク情報整備（標識） | 圏域内市町 |
| 肱川圏域総合流域防災事業 | 土砂災害リスク情報整備（標識） | 圏域内市町 |
| 愛媛南部圏域総合流域防災事業 | 土砂災害リスク情報整備（標識） | 圏域内市町 |
| 浦山川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 |
| 堀子川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 |
| 西谷川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 |
| 面白川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 |
| 大地川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 |
| 多領須川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 |
| 細谷川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 四国中央市 |
| 大川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 今治市 |
| 国道川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 上島町 |
| ノウ谷川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 久万高原町 |
| 小松谷川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 久万高原町 |
| 前川総合流域防災事業 | 緊急改築 | 久万高原町 |
| 岡村開地地区外総合流域防災事業 | 緊急改築 | 今治市、上島町 |
| 長早西地区外総合流域防災事業 | 緊急改築 | 西予市、八幡浜市、伊方町 |
| 水荷浦地区外総合流域防災事業 | 緊急改築 | 宇和島市 |
| 愛媛東部圏域総合流域防災事業 | 長寿命化計画策定 | 圏域内市町 |
| 重信川圏域総合流域防災事業 | 長寿命化計画策定 | 圏域内市町 |
| 面河川圏域総合流域防災事業 | 長寿命化計画策定 | 圏域内市町 |
| 肱川圏域総合流域防災事業 | 長寿命化計画策定 | 圏域内市町 |
| 愛媛南部圏域総合流域防災事業 | 長寿命化計画策定 | 圏域内市町 |
