社会資本総合整備計画　事後評価書

計画名：　道路構造物の長寿命化等戦略的な維持管理の維持管理の推進及び南海トラフ地震に備えた防災対策等（防災・安全）

道路維持課

社会資本総合整備計画　事後評価書~~（中間評価書）~~

令和８年　　月　　日

計画の名称	2　道路構造物の長寿命化等戦略的な維持管理の推進及び南海トラフ地震に備えた防災対策等（防災・安全）
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　（5年間）
交付対象	愛媛県, 四国中央市, 新居浜市, 上島町, 伊予市, 松前町, 大洲市, 内子町, 西予市, 伊方町, 宇和島市, 松野町, 愛南町, 東温市, 砥部町, 八幡浜市, 西条市

計画の目標

今後３０年以内に７０％以上の確率で発生が予測されている南海トラフ地震などの大規模災害等に備え、道路施設を適切に維持・修繕し、また災害に強い道路網を構築するとともに、それに関連する施設整備を行い、安全で安心して暮らせる地域を形成する。

計画の成果目標（定量的指標）

・防災対策箇所整備率　Ｒ６までに防災対策箇所整備率を９８％から９９％に向上させる。

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)	達成率	備考
①県が指定している緊急輸送道路における橋梁耐震対策、法面対策、トンネル保全対策が必要な箇所の整備率 （防災対策箇所整備率）＝（対策箇所数）／（要対策箇所数） 目標値： 実績値：	98%	98%	99% 98%	99%	用地買収の難航や事業費不足により進捗が低下。

全体事業費（計画）	合計（A＋B＋C＋D）	33,432百万円	A	33,422百万円	B	0百万円	C	10百万円	D	00百万円	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C＋D）	0.0%	進捗率（実施事業費/全体事業費）	39%
実施事業費（最終）	合計（A＋B＋C＋D）	12,878百万円	A	12,870百万円	B	0百万円	C	8百万円	D	00百万円	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C＋D）	0.1%		

１．交付対象事業

A1　道路事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） R2	R3	R4	R5	R6	全体事業費（百万円）	実施事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
A01-001	道路	一般	愛媛県	直接	－	国道	修繕	（国）１９７号ほか（補助国道）（法面・盛土・擁壁等修繕）	法面・盛土・擁壁等修繕	管内一円						600	528	88	
A01-002	道路	一般	愛媛県	直接	－	都道府県道	修繕	（主）壬生川新居浜野田線ほか（県道）（法面・盛土・擁壁等修繕）	法面・盛土・擁壁等修繕	管内一円						1,100	750	68	
A01-003	道路	一般	愛媛県	直接	－	国道	修繕	（国）１９７号ほか（補助国道）（道路附属物修繕）	道路附属物修繕	管内一円						200	31	16	
A01-004	道路	一般	愛媛県	直接	－	都道府県道	修繕	（主）壬生川新居浜野田線ほか（県道）（道路附属物修繕）	道路附属物修繕	管内一円						900	101	11	
A01-005	道路	一般	愛媛県	直接	－	－	計画調査	道路施設点検	道路施設点検	管内一円						500	34	7	
A01-006	道路	一般	愛媛県	直接	－	国道	修繕	（国）１９７号ほか（補助国道）法面防災対策	法面防災対策	管内一円						1,000	1,031	103	
A01-007	道路	一般	愛媛県	直接	－	都道府県道	修繕	（主）壬生川新居浜野田線ほか（県道）法面防災対策	法面防災対策	管内一円						1,600	1,720	108	
A01-008	道路	一般	愛媛県	直接	－	国道	修繕	（国）１９７号ほか（補助国道）橋梁耐震補強	橋梁耐震補強	管内一円						277	157	57	
A01-009	道路	一般	愛媛県	直接	－	都道府県道	修繕	（主）壬生川新居浜野田線ほか（県道）橋梁耐震補強	橋梁耐震補強	管内一円						2,447	879	36	
A01-010	道路	一般	愛媛県	直接	－	都道府県道	修繕	（主）小田柳谷線（県道）橋梁耐震補強	橋梁架替え	内子町						80	0	0	
A01-011	道路	一般	愛媛県	直接	－	国道	交安	（国）３１９号（法皇トンネル）トンネル非常用設備	トンネル非常用設備	四国中央市						130	19	15	
A01-012	道路	一般	愛媛県	直接	－	国道	交安	（国）３１７号（水ヶ峠トンネル）トンネル非常用設備	トンネル非常用設備	今治市						250	122	49	
A01-013	道路	一般	愛媛県	直接	－	国道	交安	（国）１９７号ほか２路線（横平トンネル他）トンネル非常用設備	トンネル非常用設備	八幡浜市						195	88	45	
A01-014	道路	一般	愛媛県	直接	－	都道府県道	交安	（一）網代鳥越線（家平歩道トンネル）トンネル非常用設備	トンネル非常用設備	愛南町						100	42	42	
A01-015	道路	一般	愛媛県	直接	－	国道	修繕	（国）１９７号ほか（補助国道）トンネル修繕	トンネル修繕	管内一円						100	63	63	
A01-016	道路	一般	愛媛県	直接	－	都道府県道	修繕	（主）壬生川新居浜野田線ほか（県道）トンネル修繕	トンネル修繕	管内一円						40	5	13	

A01-017	道路	一般	愛媛県	直接	―	国道	修繕	（国）１９７号ほか（補助国道）舗装補修	舗装補修	管内一円		2,000	778	39	
A01-018	道路	一般	愛媛県	直接	―	都道府県道	修繕	（主）壬生川新居浜野田線ほか（県道）舗装補修	舗装補修	管内一円		3,500	1,288	37	
A01-019	道路	一般	愛媛県	直接	―	国道	修繕	（国）１９７号ほか（補助国道）構造物修繕（路面陥没対策）	排水構造物等修繕	管内一円		700	118	17	
A01-020	道路	一般	愛媛県	直接	―	都道府県道	修繕	（主）壬生川新居浜野田線ほか（県道）構造物修繕（路面陥没対策）	排水構造物等修繕	管内一円		1,800	174	10	
A01-021	道路	一般	愛媛県	直接	―	国道	計画調査	（国）１９７号ほか（補助国道）路面性状調査・路面下空洞調査	路面性状調査・路面下空洞調査	管内一円		300	40	13	
A01-022	道路	一般	愛媛県	直接	―	都道府県道	計画調査	（主）壬生川新居浜野田線ほか（県道）路面性状調査・路面下空洞調査	路面性状調査・路面下空洞調査	管内一円		1,000	89	9	
A01-023	道路	一般	愛媛県	直接	―	都道府県道	修繕	（主）壬川新居浜野田線ほか（県道）道路冠水対策	道路冠水対策	管内一円		50	21	41	
A01-024	道路	一般	四国中央市	直接	―	市町村道	修繕	（１）新宮中央線ほか１１４路線	舗装修繕	四国中央市		1,500	351	23	
A01-025	道路	一般	四国中央市	直接	―	市町村道	修繕	（２）川渕線ほか４路線□	法面・盛土・擁壁対策	四国中央市		522	176	34	
A01-026	道路	一般	四国中央市	直接	―	市町村道	改築	（１）新宮中央線　上山２	現道拡幅　L=1.15km	四国中央市		568	99	18	
A01-027	道路	一般	四国中央市	直接	―	市町村道	改築	（１）国道海岸線ほか１路線	耐震対策	四国中央市		120	45	37	
A01-028	道路	一般	新居浜市	直接	―	市町村道	修繕	（他）大島支線	法面対策等	新居浜市		321	99	31	
A01-029	道路	離島	上島町	直接	―	市町村道	修繕	（１）佐島循環線ほか（舗装補修）	舗装補修	上島町		100	73	73	
A01-030	道路	離島	上島町	直接	―	市町村道	修繕	（１）佐島循環線ほか（法面対策）	法面対策	上島町		90	56	62	
A01-031	道路	一般	伊予市	直接	―	市町村道	修繕	（１）下吾川上野線ほか	計画策定・舗装補修	伊予市		200	112	56	
A01-032	道路	一般	松前町	直接	―	市町村道	修繕	（２）東６４号線ほか	舗装補修	松前町		200	206	103	
A01-033	道路	一般	松前町	直接	―	市町村道	修繕	道路附属物修繕	道路照明	松前町		5	0	0	
A01-034	道路	一般	大洲市	直接	―	市町村道	修繕	（１）立道線ほか	舗装補修	大洲市		260	97	37	
A01-035	道路	一般	内子町	直接	―	市町村道	修繕	（１）内子喜多山線ほか５５路線	舗装修繕	内子町		80	34	43	
A01-036	道路	一般	西予市	直接	―	市町村道	修繕	（１）市道１級路線７号線	舗装補修	西予市		175	65	37	
A01-037	道路	一般	西予市	直接	―	市町村道	修繕	（１）市道本村窪ヶ市線外	法面対策	西予市		200	0	0	
A01-038	道路	一般	西予市	直接	―	市町村道	修繕	（１）徳城荷刺1号線、荷刺徳城2号線	舗装補修	西予市		100	0	0	
A01-039	道路	一般	伊方町	直接	―	市町村道	修繕	（１）奥石見線ほか（舗装補修）	舗装補修	伊方町		15	0	0	
A01-040	道路	一般	伊方町	直接	―	市町村道	修繕	（１）奥石見線ほか（道路構造物修繕）	道路構造物修繕	伊方町		100	41	41	
A01-041	道路	一般	伊方町	直接	―	市町村道	計画調査	道路構造物の点検	道路構造物の点検	伊方町		30	0	0	
A01-042	道路	一般	伊方町	直接	―	市町村道	計画調査	道路構造物修繕計画策定	道路構造物修繕計画策定	伊方町		10	0	0	
A01-043	道路	一般	宇和島市	直接	―	市町村道	交安	（他）伊吹町２３号線ほか	防護柵	宇和島市		15	2	16	
A01-044	道路	一般	松野町	直接	―	市町村道	計画調査	法面・盛土・擁壁等点検	法面・盛土・擁壁等点検	松野町		10	4	41	
A01-045	道路	一般	松野町	直接	―	市町村道	修繕	（他）滝の平線ほか	法面対策等	松野町		150	75	50	
A01-046	道路	一般	愛南町	直接	―	市町村道	修繕	（１）日土小屋ノ浦線ほか	舗装補修　L=2.0km	愛南町		44	47	107	
A01-047	道路	一般	愛南町	直接	―	市町村道	計画調査	路面性状調査	路面性状調査	愛南町		26	17	66	
A01-048	道路	一般	愛南町	直接	―	市町村道	改築	（他）長谷線ほか２路線	橋梁耐震補強	愛南町		50	0	0	
A01-049	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府県道	交安	（主）平城高茂岬線　高茂	防護柵	愛南町		90	13	14	
A01-050	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	（国）１９７号ほか　菅田町ほか	防護柵	大洲市		150	13	9	

A01-051	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府県道	交安	（一）高茂岬船越線　福浦	防護柵	愛南町					100	0	0	
A01-052	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	（国）３１９号ほか３路線　中曽根ほか	道路情報表示板	四国中央市					150	36	24	
A01-053	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府県道	交安	（主）中島環状線ほか２路線　宇和間ほか	防護柵	松山市					80	3	4	
A01-054	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	（国）３８０号ほか３路線　露峰ほか	道路情報表示板	久万高原町					95	85	89	
A01-055	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府県道	交安	（主）平城高茂岬線ほか　御荘平城ほか	道路情報表示板	愛南町					95	15	15	
A01-056	道路	一般	新居浜市	直接	新居浜市	市町村道	改築	（他）角野関の戸線ほか	橋梁耐震補強	新居浜市					178	162	91	
A01-057	道路	一般	内子町	直接	－	市町村道	交安	（１）本町田中線ほか２路線	無電柱化　L=1.2km	内子町					600	69	11	
A01-058	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府県道	交安	（主）大三島環状線ほか1路線 野々江	防護柵	今治市					80	0	0	
A01-059	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	改築	（国）１９４号ほか１路線（寒風山トンネル他）トンネル非常用設備	トンネル非常用設備	西条市他					300	13	4	
A01-060	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	修繕	（国）１９７号ほか（補助国道）（トンネル照明灯LED化）	トンネル照明灯LED化	管内一円					918	0	0	
A01-061	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府県道	修繕	（主）新居浜別子山線ほか（県道）（トンネル照明灯LED化）	トンネル照明灯LED化	管内一円					722	299	41	
A01-062	道路	一般	愛媛県	直接	－	国道	修繕	（国）３１７号ほか（補助国道）舗装補修	舗装補修	管内一円					1,500	661	44	
A01-063	道路	一般	愛媛県	直接	－	都道府県道	修繕	（主）新居浜角野線ほか（県道）舗装補修	舗装補修	管内一円					2,700	1,241	46	
A01-064	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	（国）１９７号　松柏ほか	道路情報表示板	八幡浜市					60	25	41	
A01-065	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府県道	交安	（一）高茂岬船越線（西海トンネル）トンネル非常用設備	トンネル非常用設備	愛南町					60	60	101	
A01-066	道路	一般	東温市	直接	東温市	市町村道	修繕	（１）一ヶ谷土谷線ほか	舗装修繕	東温市					100	25	25	
A01-067	道路	一般	砥部町	直接	砥部町	市町村道	修繕	（１）高尾田麻生線ほか	道路施設点検	砥部町					9	0	0	
A01-068	道路	一般	松野町	直接	松野町	市町村道	修繕	（１）延野々吉野線	法面対策等	松野町					81	10	12	
A01-069	道路	一般	松前町	直接	松前町	市町村道	計画調査	路面性状調査	路面性状調査	松前町					7	6	87	
A01-070	道路	一般	宇和島市	直接	宇和島市	市町村道	計画調査	道路構造物の点検	道路構造物の点検	宇和島市					19	14	74	
A01-071	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府県道	交安	（主）新居浜角野線　西喜光地町	道路標識	新居浜市					7	6	89	
A01-072	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府県道	交安	（主）壬生川新居浜野田線　小松町新屋敷	道路標識	西条市					3	3	100	
A01-073	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府県道	交安	（一）森松重信線ほか　田窪ほか	道路標識	東温市					11	9	86	
A01-074	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	（国）１９７号ほか（補助国道）道路標識	道路標識	管内一円					1	0	20	
A01-075	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府県道	交安	（主）新居浜別子山線ほか（県道）道路標識	道路標識	管内一円					1	1	87	
A01-076	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	（国）３１７号　宿野町ほか	道路情報表示板	松山市					72	4	5	
A01-077	道路	一般	新居浜市	直接	新居浜市	市町村道	修繕	（１）駅裏角野線ほか	舗装修繕	新居浜市					146	58	40	
A01-078	道路	一般	八幡浜市	直接	八幡浜市	市町村道	計画調査	路面性状調査	路面性状調査	管内一円					5	4	78	
A01-079	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	－	計画調査	道路施設点検	道路構造物点検	管内一円					500	144	29	
A01-080	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	（国）４４０号　柳井川	トンネル補助警報表示版	久万高原町					20	0	0	
A01-081	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	（国）３２０号ほか　奈良ほか	道路情報表示板	鬼北町					132	0	0	
A01-082	道路	一般	西条市	直接	西条市	市町村道	計画調査	道路附属物点検	道路施設点検	西条市					60	25	41	
A01-083	道路	一般	愛南町	直接	愛南町	市町村道	修繕	小山線	法面対策　L=60m	愛南町					30	5	15	
A01-084	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	修繕	（国）４３７号　中央～久万ノ台ほか	舗装補修	松山市					80	80	100	

A01-085	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	計画調査	（国）１９７号ほか（補助国道）（土工構造物点検）	道路盛土防災点検	管内一円					[redacted]	200	64	32	
A01-086	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府県道	計画調査	（主）壬生川新居浜野田線ほか（県道）（土工構造物点検）	道路盛土防災点検	管内一円					[redacted]	300	39	13	
															小計（道路事業）	33,422	12,870		

B　関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容（延長・面積等）	市町村名港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	実施事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
										R2	R3	R4	R5	R6				
														合計	0	0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C　効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	全体事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
										R2	R3	R4	R5	R6				
C01-001	道路	一般	内子町	間接	電線管理者	ー	単独地中化事業	電線等の撤去１式	内子町	[redacted]					10	8	82	
														合計	10	8		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
C01-001	基幹事業と一体となって実施することで、より道路の防災性向上及び安全で快適な通行空間の確保等を図ることが可能。	

D　社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市町村名港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	全体事業費（百万円）	進捗率（%）	備考
											R2	R3	R4	R5	R6				
																		#DIV/0!	
															合計	0	0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況


Ⅰ定量的指標に関連する交付対象事業（各要素事業）の効果の発現状況	・橋梁の耐震対策や法面対策、トンネル保全対策等の事業を推進し、災害に強い道路網の構築に寄与した。
Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）	

３．特記事項（今後の方針等）

引き続き、事業を推進し、災害に強い道路網の構築を図る。

（参考図面）社会資本整備総合交付金

計画の名称	2　道路構造物の長寿命化等戦略的な維持管理の推進及び南海トラフ地震に備えた防災対策等（防災・安全）		
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　（5年間）	交付対象	愛媛県, 四国中央市, 新居浜市, 上島町, 伊予市, 松前町, 大洲市, 内子町, 西予市, 伊方町, 宇和島市, 松野町, 愛南町, 東温市, 砥部町, 八幡浜市, 西条市

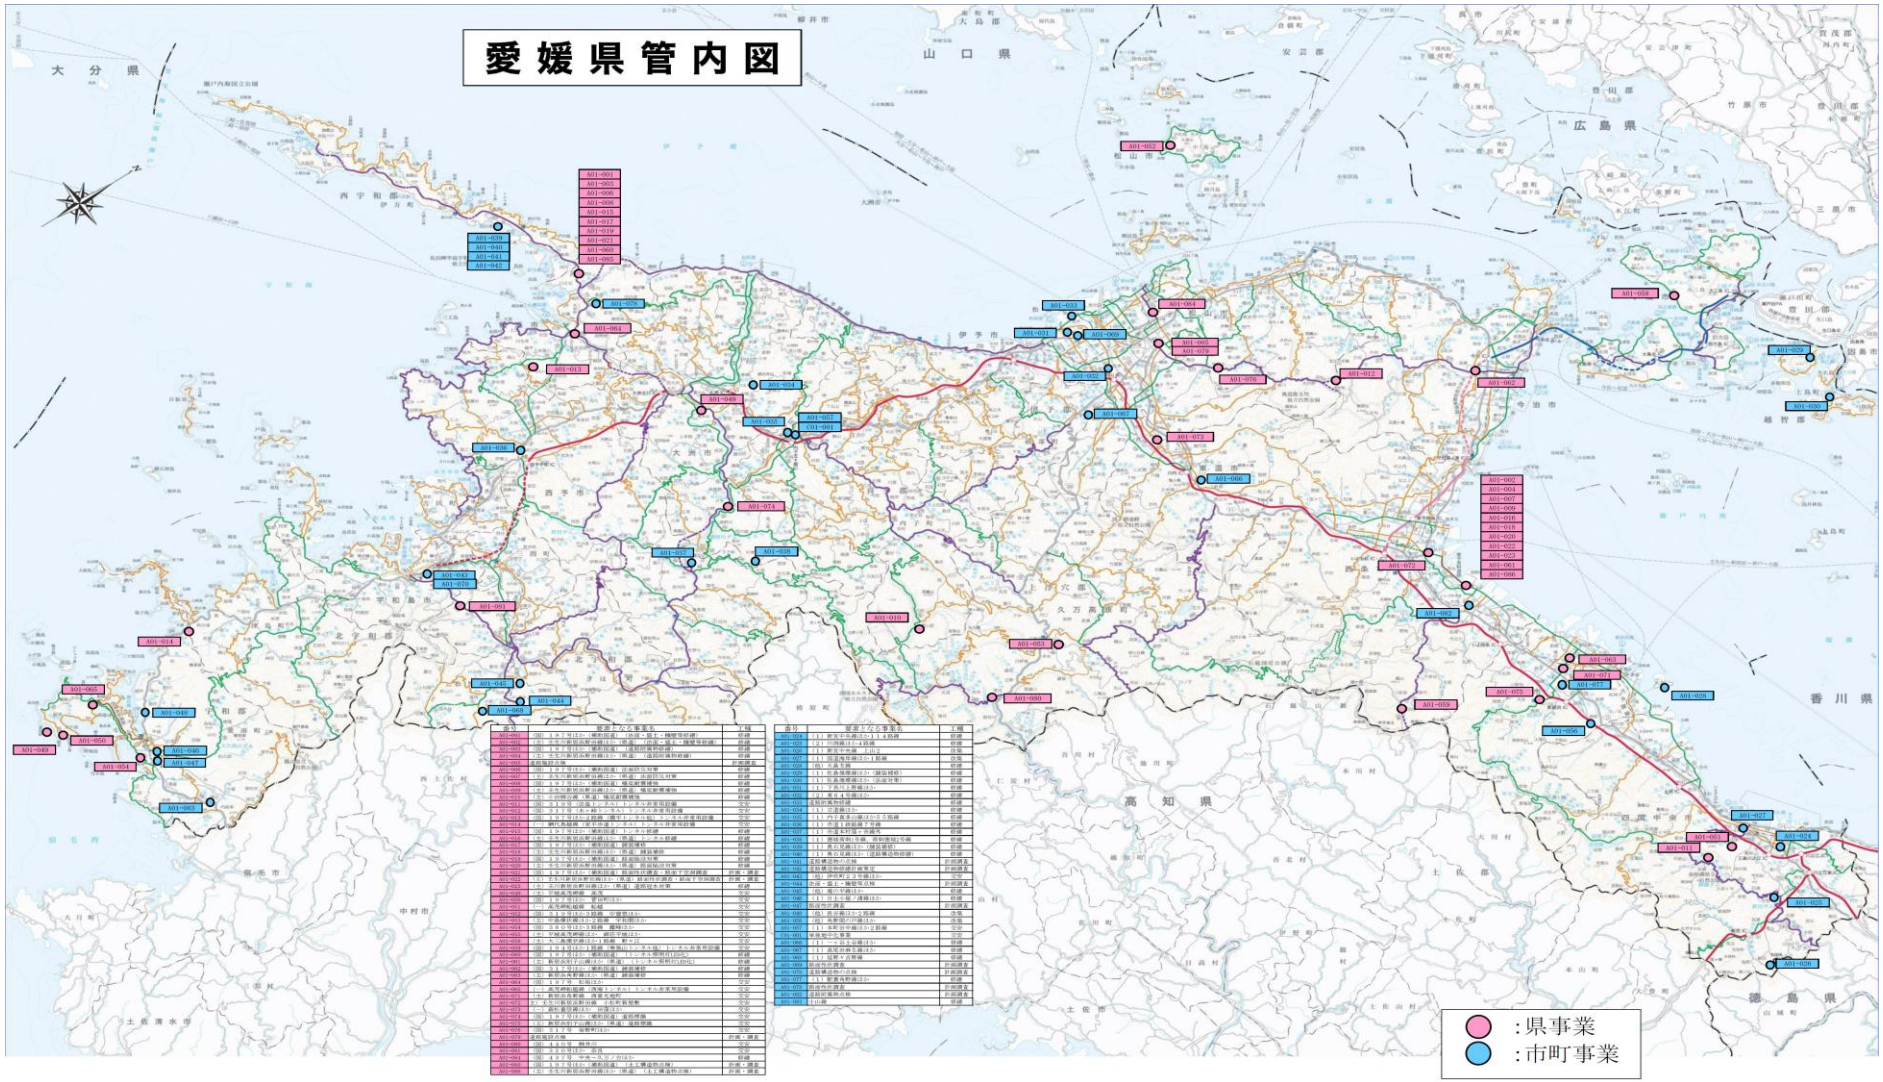

事業概要

（主）宇和島城辺線　南宇和郡愛南町僧都

法面対策事業

主要地方道宇和島城辺線は、愛媛県宇和島市祝森を起点として、愛南町城辺甲へと至る主要地方道であり、路線沿線の僧都、山出、梶郷及び緑地区と愛南町中心部を結ぶ唯一の生活道路である。また、災害時には国道56号を補完する2次緊急輸送道路に指定されている。

平成30年度道路防災総点検の結果、要対策とされた落石等危険箇所の対策を行い、降雨、地震時において安全・安心な道路を確保した。

整備前



整備後



（一）多喜浜泉川線　城下橋

橋梁耐震補強事業

県道多喜浜泉川線は、新居浜市又野1丁目を起点として坂井町二丁目へ至る延長2．5kmの一般県道であり、JR予讃線多喜浜駅付近と新居浜駅付近を結ぶ、地域防災上、非常に重要な路線である。

当該箇所の城下橋については、耐震補強を実施することにより、震災時の避難路や物資輸送路を確保するとともに、道路網の安全性・信頼性の確保を行った。

整備前



整備後

