
愛媛県優良建設工事知事表彰受賞者一覧表（令和８年度）《土木部関係》

東中南予の五十音順

ふりがな 組織名	ふりがな 代表者名	工事名	工事箇所
あんどうこうぎょう 安藤工業㈱	あんどう　ぜんた 安藤　善太	産業連携港湾整備工事	西条市ひうち地先
いづも いづも㈱	みた　たいら 三田　平	広域河川改修工事(受注者希望型ＩＣＴモデル工事)	今治市小泉
いはらこうぎょう 井原工業㈱	いはら　しん 井原　伸	港湾局部改良工事	四国中央市村松町
おおはらぐみ ㈱大原組	おおはら　かずと 大原　一人	道路改築工事	新居浜市別子山日浦
さくらいこうぎょう 桜井工業㈱	たなか　けんいち 田中　賢一	道路改築工事	今治市玉川町龍岡上
しらいしけんせつこうぎょう 白石建設工業㈱	しらいし　よしひろ 白石　尚寛	道路改築工事	新居浜市東田
じんのぐみ ㈲神野組	じんの　ともふみ 神野　智史	通常砂防工事	今治市宮窪町宮窪
だいおう ㈱大旺	おち　まさかず 越智　雅一	道路改築工事(受注者希望型ＩＣＴモデル工事)	今治市玉川町龍岡上
にしやまけんせつ 西山建設㈱	にしやま　ようぞう 西山　陽三	総合流域防災工事	四国中央市土居町土居
よしゅうこうぎょう ㈱予州興業	みよし　まさただ 三好　正忠	急傾斜地崩壊対策工事	四国中央市金生町山田井
あいきょう ㈱愛橋	にのみや　としひこ 二宮　俊彦	高野川橋建設工事	伊予市三秋～双海町高野川
いずみけんせつ 泉建設㈱	いずみ　しんいち 泉　慎一	海岸高潮対策工事(受注者希望型ＩＣＴモデル工事)	伊予市尾崎
たかやまけんせつ ㈱高山建設	たかやま　てつや 高山　哲也	急傾斜地崩壊対策工事	上浮穴郡久万高原町日野浦
ぬまだけんせつ ㈱沼田建設	ぬまだ　まさよし 沼田　真禎	通常砂防工事	上浮穴郡久万高原町菅生
ふくだぐみ ㈱福田組	わきだ　しゅういち 脇田　修一	地震防災関連道路緊急整備工事(受注者希望型ＩＣＴモデル工事)	松山市中島粟井
ふたがみぐみ ㈱二神組	しのなが　たかし 篠永　尚史	社会資本整備総合交付金工事(受注者希望型ＩＣＴモデル工事)	松山市南江戸５丁目
りんかいけんせつ 臨海建設㈱	いわさき　しんいちろう 岩崎　真一郎	道路改築工事(受注者希望型ＩＣＴモデル工事)	伊予市三秋～双海町高野川
おおつかぐみ ㈱大塚組	おおつか　ゆうすけ 大塚　裕介	道路改築工事他	西予市野村町野村
じょうとうけんせつ ㈲城東建設	なかはた　ひでかず 中畑　秀一	通常砂防工事	宇和島市吉田町立間
こうのかいはつ 河野開発㈱	こうの　ていじ 河野　禎司	通常砂防工事	喜多郡内子町小田
こじまぐみ ㈱小島組	こじま　ゆうさく 小島　勇策	土砂災害対策道路工事	宇和島市津島町成
こてがわこうぎょう 小手川工業㈱	こてがわ　ひろし 小手川　洋	大根第二橋建設工事	大洲市平野町野田
とみながけんせつ 富永建設㈱	おおの　たくや 大野　拓也	生活道路改良整備工事	大洲市河辺町川崎
なかがわけんせつ 中川建設㈱	なかた　とみえ 中田　富恵	通常砂防工事	喜多郡内子町中川
はだけんせつ ㈱羽田建設	はだ　まさゆき 羽田　正行	通常砂防工事	南宇和郡愛南町小山
ひょうどうけんせつ 兵頭建設㈱	ひょうどう　けいじ 兵頭　恵二	生活道路改良整備工事	宇和島市津島町野井
ひらのけんせつ 平野建設㈱	ひらの　たけくに 平野　武邦	道路改築工事(受注者希望型ICTモデル工事)	西予市明浜町狩浜
ふじかわけんせつ 藤川建設㈲	ふじかわ　こうじ 藤川　広治	原子力防災緊急時避難円滑化工事	西宇和郡伊方町小島
ほったけんせつ 堀田建設㈱	きくち　やすゆき 菊池　泰行	通常砂防工事	八幡浜市保内町須川
ほりべけんせつ 堀部建設㈱	ほりべ　よしひさ 堀部　好久	交通安全対策工事(受注者希望型ICTモデル工事)	西予市宇和町明石

令和8年度　愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

（土木部）

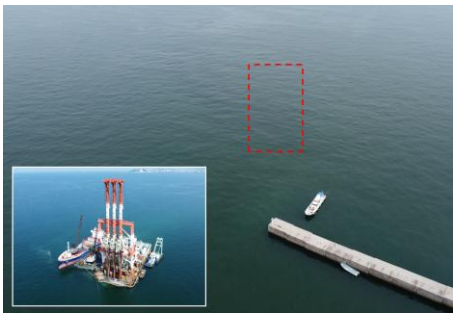

業 者 名 ： 安藤工業(株)
工 事 名 ： 産業連携港湾整備工事
工事箇所 ： 西条市ひうち地先

事業概要：
本工事は、（重）東予港（西条地区）における防波堤延伸工事であり、工事施工に当たっては、周辺漁業者への配慮のため６月から９月という限られた期間でしか施工ができないこと、また、今治造船関連企業が資材運搬を行っている航路内にアンカーロープを取る必要があり、大型船が入出港する際は一時退避が必要になるなど、厳しい現場条件であったが、周辺企業と綿密に工程調整を行うことにより工期内に工事を完成させることができた。
さらに、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、施工管理記録等から優れた出来栄えが確認できる。

施工延長　L=84.0m
締固工（ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ）N=600本



業 者 名 ： いづも(株)
工 事 名 ： 広域河川改修工事(受注者希望型ＩＣＴモデル工事)
工事箇所 ： 今治市小泉

事業概要：
本工事は、（二）日吉川の護岸改修に伴い架け替えが必要となる市道橋の橋台工事である。
工事箇所は、市道や国道が隣接し、周辺には多くの人家や店舗が連なっていることや、当該橋梁は店舗への主要な出入り口も兼ねていることから、施工に当たっては一般交通の安全確保に細心の注意を払い、通行の確保及び交通管理を厳重に実施した。
また、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長　L=10.4m、橋台躯体工　N=1基
コンクリートブロック積　A=29m2
仮設工（仮締切工）　N=1式



業 者 名 ： 井原工業(株)
工 事 名 ： 港湾局部改良工事
工事箇所 ： 四国中央市村松町

事業概要：
本工事は、四国中央市村松町における（重）三島川之江港の長寿命化を目的とした岸壁の防食工事である。
施工箇所は、岸壁の利用があるなか、適切な利用間調整を行ったことにより、岸壁利用者から苦情等もなく、安全かつ計画的に工事を完成させた。
また、構造物は、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長 L=90m
電気防食工 N=51個
被覆防食工 A=352m2



業 者 名 ： (株)大原組
工 事 名 ： 道路改築工事
工事箇所 ： 新居浜市別子山日浦

事業概要：
本工事は、（主）新居浜別子山線における道路拡幅を目的とした軽量盛土工事である。
急峻な地形かつ上空に特別高圧線が存在し、作業構台設置及び重機使用の制限される工事であったが、安全対策や下請への指導を適切に行い事故等が無かった。
また場所打杭工及び鉄筋挿入工において地盤条件の変更に対して適切に対応しており、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長　L=96.0m、道路幅員　W=4.0(6.0)m
軽量盛土工　V=268m3、壁面工　A=105m2
防護柵工　L=98m

令和8年度　愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

（土木部）



業 者 名 ： 桜井工業(株)
工 事 名 ： 道路改築工事
工事箇所 ： 今治市玉川町龍岡上

事業概要：
本工事は、国道317号今治市玉川町龍岡上における道路改築工事であり、現場は見通しが悪く、現況は2車線道路であるが道路幅員約6mで狭隘な区間であり、松山へ向かう幹線道路のため交通量が多く、土砂の搬出及び資材搬入が困難であったが、車両の通行を確保しつつ斜面掘削を行い、構造物を完成させた。
また、積極的に工事に関する提案を行って問題解決を図り、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長　L=98.7m、道路幅員　W=6.0（8.0）m
ﾌﾞﾛｯｸ積工　A=243m2、排水構造物工　L=98m
仮設防護柵工　A=180m2



業 者 名 ： 白石建設工業(株)
工 事 名 ： 道路改築工事
工事箇所 ： 新居浜市東田

事業概要：
本工事は、新居浜都市圏の南北の交通軸を担う、（一）新居浜東港線の道路改良工事であり、バイパス区間の橋梁下部工の工事である。
住宅地内の工事であり進入経路も狭隘であったものの、場所打ち杭の施工や資材等の搬入にあたっては、工程に係る近隣住民との調整を積極的に行い、トラブルもなく、計画的に工事進捗を図り完成させた。
また、箱型橋台の施工に関しては、竪壁に打継目が生じないよう日当り打設量を多くする必要があったものの、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

箱型橋台　N=1基
場所打杭　N=15本



業 者 名 ： (有)神野組
工 事 名 ： 通常砂防工事
工事箇所 ： 今治市宮窪町宮窪

事業概要：
本工事は、（砂）イモホリ川における通常砂防事業として、砂防堰堤本堤の整備を行ったものである。
施工に際し、基礎岩盤が想定以上に硬く硬岩が露出したため、当初の掘削計画を見直し、効率的かつ安全な施工を目的に岩盤掘削工法を静的破砕工法へ変更追加して実施した。この工法変更により、掘削作業の精度と安全性を確保するとともに、施工期間の短縮と工事品質の向上を実現した。
また、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

砂防堰堤（堤高7.5m,堤長39.75m）
ｺﾝｸﾘｰﾄ　H=7.5m L=15.20m V=328m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　A=28m2



業 者 名 ： (株)大旺
工 事 名 ： 道路改築工事（受注者希望型ＩＣＴモデル工事）
工事箇所 ： 松山市道後湯之町

事業概要：
本工事は、国道317号今治市玉川町龍岡上における道路改築工事であり、現場は見通しが悪く、現況は2車線道路であるが道路幅員約6mで狭隘な区間であり、松山へ向かう幹線道路のため交通量が多く、土砂の搬出及び資材搬入が困難であったが、車両の通行を確保しつつ斜面掘削を行い、構造物を完成させた。
また、積極的に創意工夫を実施し、現場の安全にも配慮し、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長　L=89.3m、道路幅員　W=6.0（8.0）m
ﾌﾞﾛｯｸ積工　A=374m2、排水構造物工　L=144m
仮設防護柵工　A=180m2

令和8年度　愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

（土木部）



業 者 名 ： 西山建設(株)

工 事 名 ： 総合流域防災工事

工事箇所 ： 四国中央市土居町土居

事業概要：

本工事は、四国中央市土居町土居における（二）関川水系関川の改築工事であり、河川護岸をブロック張にて施工するものである。

工事に際しては、地元関係者との調整など積極的な対応を行うなど綿密な工程管理および安全管理により、安全かつ着実に工事を完成させた。

また、構造物は、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長 L=111m
ブロック張 A=558m2
根固め工 N=75個、河床掘削 V=2,100m3



業 者 名 ： (株)予州興業

工 事 名 ： 急傾斜地崩壊対策工事

工事箇所 ： 四国中央市金生町山田井

事業概要：

本工事は、（急）表地区における急傾斜地崩壊対策事業として、擁壁と落石防護柵を整備した工事である。

施工箇所が人家に近接していたため、地元関係者との綿密な調整とともに細心の注意を払って施工を行った結果、事故やトラブルもなく円滑に工事を完成させた。

また、構造物は、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長 L=40.9m
擁壁工 V=152m3、落石防護柵 L=52.0m
石積工 A=208m2



業 者 名 ： (株)愛橋

工 事 名 ： 高野川橋建設工事

工事箇所 ： 伊予市三秋～双海町高野川

事業概要：

本工事は、(国)３７８号の三秋バイパスにおいて施工した橋梁の桁製作・架設工事である。

本工事箇所は、冬季風浪による影響をうけるほか、現道上での架設工事であることや、作業場所と民家が隣接しているなど厳しい現場条件の中、施工に際し日々の工程管理に細心の注意を払いながら、地元調整を円滑に行いつつ、品質向上のための対策を講じ、事故や苦情等もなく、安全に工事を完成させた。

現場は、豊富な経験と卓越した技術力により、出来形・外観とも優れた出来栄えとなっている。

高野川橋 橋長　L=108.4m
道路幅員　W=6.5(8.0)m
3径間連結PCｺﾝﾎﾟ桁橋 桁製作・架設工　L=106.8m



業 者 名 ： 泉建設(株)

工 事 名 ： 海岸高潮対策工事（受注者希望型ＩＣＴモデル工事

工事箇所 ： 伊予市尾崎

事業概要：

本工事は、伊予港海岸において施工した海岸高潮対策工事である。

本工事箇所は伊予灘沿岸の外海に面し、潮位変化や台風・冬季波浪等による影響をうけるほか背後には家屋等が近接するなど厳しい現場条件の中、施工に際し日々の工程管理に細心の注意を払いながら、地元調整を円滑に行う必要があったが、ＩＣＴの活用や品質向上のための対策を講じるとともに、週休２日を達成しつつ、事故や苦情等もなく、安全に工事を完成させた。

現場は、豊富な経験と卓越した技術力により、出来形・外観とも優れた出来栄えとなっている。

護岸工　L=60m
工事用道路工　L=115m

令和8年度　愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

（土木部）



業 者 名 ： (株)高山建設

工 事 名 ： 急傾斜地崩壊対策工事

工事箇所 ： 上浮穴郡久万高原町日野浦

事業概要：

本工事は、久万高原町日野浦における（急）馬門地区の急傾斜地崩壊対策工事である。

本工事では、コンクリートの打設、締固め、養生などの各工程を適切に実施するとともに、きめ細かな施工管理を行い、着実に工事を完成させた。

また、地元関係者との調整を綿密に行うことで、事故やトラブル等もなく円滑に工事を進捗させた。

さらに豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長　L=15.5m
重力式擁壁工　V=141m3
雑石積工　A=107m2



業 者 名 ： (株)沼田建設

工 事 名 ： 通常砂防工事

工事箇所 ： 上浮穴郡久万高原町菅生

事業概要：

本工事は、久万高原町菅生における（砂）今戸川の通常砂防工事であり、ＩＣＴ土工のみならず、施工するすべての構造物の三次元設計データを作成し、きめ細かな施工管理を行い、着実に工事を完成させた。

当現場で開催した県主催の「ＩＣＴ活用工事トップセミナー」では、ＩＣＴ施工の普及促進に積極的に取り組むとともに、週休2日確保工事として施工し、働き易い職場環境づくりに努めた。

また、地元関係者との調整を綿密に行うことで、事故やトラブル等もなく円滑に工事を進捗させた。

さらに豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長　L=39.6m、山留ﾌﾞﾛｯｸ積工　A=208m2
路側ﾌﾞﾛｯｸ積工　A=83m2、コンクリート舗装　A=88m2



業 者 名 ： (株)福田組

工 事 名 ： 地震防災関連道路緊急整備工事(受注者希望型ＩＣＴモデル工事)

工事箇所 ： 松山市中島粟井

事業概要：

本工事は、（主）中島環状線における離島での道路改良工事である。

TS・GNSSを用いた土砂の締固め管理を実施し、補強土壁の品質向上を図るとともに、建設現場におけるＩＣＴ化の推進に取り組み、働き易い職場環境づくりに努めた。

また、地元関係者との調整を綿密に行うことで、事故やトラブル等もなく円滑に工事を進捗させるとともに、地元高校生のインターン受け入れなど、担い手確保の活動にも積極的に取り組んだ。

離島という施工条件の制約にも関わらず、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長　L=59.7m、道路幅員　W=5.5(7.0)m
ﾌﾞﾛｯｸ積工　A=67m2
補強土壁工　A=263m2



業 者 名 ： (株)二神組

工 事 名 ： 社会資本整備総合交付金工事（受注者希望型ＩＣＴモデル工事

工事箇所 ： 松山市南江戸５丁目

事業概要：

本工事は、ＪＲ松山駅西口と環状線を結ぶ都市計画道路松山駅西口南江戸線における東古照橋の下部工工事である。

施工箇所は、人家密集地域にあることから、事前に地元住民に周知するなど、騒音・振動、安全対策への配慮を欠かさない対応により、トラブルなく施工を完了した。

また、３次元測量の活用による建設現場におけるＩＣＴ化の推進や、週休二日の確保による働き易い職場環境づくり、大学生を対象にした現場見学会の開催による建設業の担い手確保への取り組みに寄与した。

現場は、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

橋長　L=21.6m、道路幅員　W=13.0（34.0）m
逆T式橋台（A2）N=1基、場所打ち杭（Φ1000）N=18本
旧橋撤去（下部工）N=1基

令和8年度　愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

（土木部）



業 者 名 ： 臨海建設(株)

工 事 名 ： 道路改築工事（受注者希望型ＩＣＴモデル工事）

工事箇所 ： 伊予市三秋～双海町高野川

事業概要：

本工事は、(国)３７８号の三秋バイパスの道路改良工事である。

３Ｄ測量による施工管理やＷＥＢカメラを用いた遠隔臨場に取り組むなどＩＣＴを活用した品質向上や作業の効率化のための対策を講じるとともに、週休２日を達成し、働きやすい職場環境づくりに努めた。

また、地元関係者との調整を綿密に行うことで、事故や苦情等もなく円滑に工事を進捗させ、安全に工事を完成させた。

現場は、豊富な経験と卓越した技術力により、出来形・外観とも優れた出来栄えとなっている。

施工延長　L=68.4m、道路幅員　W=6.5(8.0)m
重力式擁壁　V=266m3、ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁　A=867m2
路側ﾌﾞﾛｯｸ積工　A=99m2



業 者 名 ： (株)大塚組

工 事 名 ： 道路改築工事他

工事箇所 ： 西予市野村町野村

事業概要：

本工事は、（国）４４１号の野村大橋架替に伴う下部工工事である。

本工事箇所は、交通量が多い現道や旧野村町の中心部に位置していることから人家が隣接しており、河川の護岸工事等関連する工事も同時進行しているという厳しい施工条件であったが、本施工業者が他工事との調整を綿密に行うことで、安全円滑に工事を完成させた。

現場は、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長　L=70.6m、旧橋撤去　L=70.6m（下部工1基）
A1橋台躯体工　V=422m3、P1橋脚躯体工　V=267m3
仮橋（リース）一式



業 者 名 ： (有)城東建設

工 事 名 ： 通常砂防工事

工事箇所 ： 宇和島市吉田町立間

事業概要：

本工事は、（二）立間川水系（砂）大明神川において、砂防堰堤を整備した工事である。

本工事箇所は、平成30年7月豪雨での被災箇所であり、再度災害防止に向け早期完成が求められる中、近隣工事との工程調整や、地元住民との調整を図り、適切な工程管理の下、円滑に工事を完成させた。

また、構造物は豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

砂防堰堤　堤高 H=14.5m、堤長 L=47.0m
ｺﾝｸﾘｰﾄ　H=5.5m L=47.0m V=749m3



業 者 名 ： 河野開発(株)

工 事 名 ： 通常砂防工事

工事箇所 ： 喜多郡内子町小田

事業概要：

本工事は、土石流から人家や道路を保全するための砂防工事として砂防堰堤や垂直壁の整備を行っている。

現場は、土石流危険渓流内の急峻な地形に加え、運動公園施設が近接しているなど、厳しい施工条件であったが、綿密な工程管理や施工管理を行い、安全かつ円滑に工事を完成させた。

また、地元住民への丁寧な説明を行い、事故・トラブルもなく完成した。

なお、構造物は、卓越した技術力と豊富な経験により、出来形・外観とも優れた出来映えであった。

砂防堰堤 堤高 H=10.0m、堤長L=37.7m
コンクリート工 H=4.0m L=32.3m V=386m3

令和8年度　愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

（土木部）



業 者 名 ： (株)小島組
工 事 名 ： 土砂災害対策道路工事
工事箇所 ： 宇和島市津島町成

事業概要：
本工事は、道路事業において山切を行い、張コンクリート擁壁及び落石防護柵を施工する工事である。
現場は狭隘であったが、保安施設の管理や、仮設防護柵及び足場、重機の点検を密に行い、徹底した安全管理を行ったことで、無事故かつ地域からの苦情もなく工事を完成させた。
施工において、ＩＣＴ技術や遠隔臨場技術を活用することで生産性向上に積極的に取り組むとともに、NETIS登録されているコンクリート専用ワイヤレス内部温湿度センサーを用いて、コンクリート内部温度を計測し、推定強度を算出することで、コンクリートの品質確保に努めた。

施工延長 L=38.7m、道路幅員 W=4.0(5.0)m
擁壁工 V=212m3、鉄筋挿入工 N=73本
落石防護柵工 L=38m



業 者 名 ： 小手川工業(株)
工 事 名 ： 大根第二橋建設工事
工事箇所 ： 大洲市平野町野田

事業概要：
本工事は、（国）１９７号地域高規格道路「夜昼道路」において、大根第二橋の鈑桁製作・架設を行う工事である。
当該工事においては、配置技術者が工事の特性を的確に理解して施工計画を立案し、高品質な構造物を安全に事故の発生なく所定の工期内に工事を完成させた。
また、周辺関係者への丁寧な説明を行うとともに、地元との交流に努めて見学会を行うなど、トラブル発生もなく完成した。
なお、現場は豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

大根第二橋　橋長　L=167.0m
道路幅員　W=3.25(5.5)m
鋼4径間連続合成少数鈑桁橋 桁製作・架設工　L=165.8m



業 者 名 ： 富永建設(株)
工 事 名 ： 生活道路改良整備工事
工事箇所 ： 大洲市河辺町川崎

事業概要：
本工事は、（一）河辺小田線の現道拡幅による改良工事としてブロック積工などを行う工事である。
本箇所は山間部で、厳しい環境の中、綿密な計画に基づき、円滑な資機材調達を行うとともに、品質や安全確保に十分配慮しながら着実に工事を進め、工期内に事故の発生なく工事を完成させた。
また、地元住民への丁寧な説明を行い、事故・トラブルもなく完成した。
なお、現場は豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観ともに優れた出来栄えである。

施工延長 L=65.0m、道路幅員 W=4.0m (5.0m)
コンクリートブロック積工 A=133m2
擁壁工 V=35m3、防護柵工 L=53m



業 者 名 ： 中川建設(株)
工 事 名 ： 通常砂防工事
工事箇所 ： 喜多郡内子町中川

事業概要：
本工事は、土石流から人家や道路を保全するための砂防工事として砂防堰堤や垂直壁の整備を行っている。
現場は、土石流危険渓流内の急峻な地形に加え、人家等が近接しているなど、厳しい施工条件であったが、綿密な工程管理や施工管理を行い、安全かつ円滑に工事を完成させた。
また、地元住民への丁寧な説明を行い、事故・トラブルもなく完成した。
なお、構造物は、卓越した技術力と豊富な経験により、出来形・外観とも優れた出来映えであった。

砂防堰堤 堤高H=14.0m、堤長L=51.6m
コンクリート工 W=51.6m H=4.7m V=388m3
コンクリートブロック積工 A=37m2

令和8年度　愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

（土木部）



業 者 名 ： (株)羽田建設
工 事 名 ： 通常砂防工事
工事箇所 ： 南宇和郡愛南町小山

事業概要：
本工事は、土石流危険渓流において砂防堰堤等を整備する砂防工事であり、工事箇所は山間部で幅員が狭小な現道を工事用道路として利用する等、現場条件が厳しい中、綿密な施工計画と適切な現場管理により作業員の事故防止に努め、安全円滑に工事を完成させた。
また、地元住民への説明も丁寧であり、事故やトラブルの発生もなかった。
現場は豊富な経験と卓越した技術力を活かして施工されており、出来形・外観ともに優れた出来映えである。

小山２砂防堰堤 堤高 H=8.0m、堤長L=46.8m
ｺﾝｸﾘｰﾄ H=8.0m L=46.8m V=1,364m3



業 者 名 ： 兵頭建設(株)
工 事 名 ： 生活道路改良整備工事
工事箇所 ： 宇和島市津島町野井

事業概要：
本工事は、道路事業において山切を行い、コンクリートブロック積擁壁及び重力式擁壁や落石防護柵を施工する工事である。
近隣地権者及び水路の切り回しに関する調整を密に行い、円滑な施工に取り組み、当初想定より早い工事完成を図った。
現場は狭隘であったが、保安施設の管理や、仮設防護柵及び足場、重機の点検を密に行い、徹底した安全管理を行ったことで、無事故かつ地域からの苦情もなく工事を完成させた。

施工延長 L=108.0m、道路幅員 W=4.0(5.0)m
コンクリートブロック積工 A=109m2
防護柵工 L=99m



業 者 名 ： 平野建設(株)
工 事 名 ： 道路改築工事（受注者希望型ICTモデル工事）
工事箇所 ： 西予市明浜町狩浜

事業概要：
本工事は、（国）378号の未改良区間において道路を補強土壁により谷側へ拡幅する道路改良工事である。
本工事箇所の現道は、幅員狭小で交通量が多く、バス路線であり、また、補強土壁施工箇所は非常に急峻な地形であることから、工事用道路の確保や補強土壁施工において困難を極めたが、適切な施工計画と徹底した進捗管理を実施し、工事の早期完成に努めるとともに、徹底した現場管理と安全教育等を実施し、現場内事故や地元とのトラブルもなく工事を完成させた。
現場は豊富な経験と技術力を活かして施工されており、出来形・外観とも優れた出来映えである。

施工延長　L=146.8m、道路幅員　W=5.5(7.0)m
補強土壁工　A=422m2、補強土壁基礎工　V=154m3
吹付工　A=633m2



業 者 名 ： 藤川建設(有)
工 事 名 ： 原子力防災緊急時避難円滑化工事
工事箇所 ： 西宇和郡伊方町小島

事業概要：
本工事は、（一）鳥井喜木津線の未改良区間において、軽量盛土により谷側へ拡幅する道路改良工事である。
本工事箇所の現道は、幅員が非常に狭く、且つ急峻な斜面を有する地形であるなど、厳しい現場条件であったが、適切な現場管理と安全教育等を実施し、現場内事故や地元とのトラブルもなく工事を完成させた。
現場は豊富な経験と技術力を活かして施工されており、出来形・外観とも優れた出来映えである。

施工延長　L=42.3m、道路幅員　W=4.0（5.0）m
鉄筋挿入工　N=64本
軽量盛土工　V=46m3

令和8年度 愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

（土木部）



業 者 名 ： 堀田建設(株)

工 事 名 ： 通常砂防工事

工事箇所 ： 八幡浜市保内町須川

事業概要：

本工事は、八幡浜市保内町須川（二）喜木川水系（砂）奥川において、砂防堰堤を新設する工事である。

当現場は、多くの下請業者が入場する中で安全かつ正確な施工が求められたが、定期的な災害防止協議会の実施に加え、第三者機関による現場確認の実施など、労働災害防止にあたり積極的な取組みが見られた。

また、施工においては、散水養生等によりコンクリートの品質を確保するとともに、現場試験や供試体の管理、打ち継ぎ目の処理等を適宜・適切に実施しており、良好な品質の確保を達成している。

現場では豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長　L=6.8m
砂防堰堤(支川2)(堤高=11.5m,堤長=57.0m)
コンクリート H=11.3m,L=57.0m,V=1,169m3



業 者 名 ： 堀部建設(株)

工 事 名 ： 交通安全対策工事（受注者希望型ICTモデル工事）

工事箇所 ： 西予市宇和町明石

事業概要：

本工事は、（一）鳥坂宇和線の新開橋架替に伴う下部工工事である。

本工事箇所は、県道と市道の交差点近くに位置しており、作業スペースが狭く、仮締切施工時の市道用地の一時使用や市道用地内に埋設されている下水道管の移設など現場条件が厳しい工事であったが、適切な現場管理を行い、また、現場作業者への安全教育の徹底により、安全円滑に工事を完成させた。

現場は、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

橋長　L=25.75m（新開橋）
壁式橋脚（P1）V=531m3
鋼矢板圧入・引抜　N=170枚
